


परिशिष्ट

परिशिष्ट 1

नवीनतम वर्ष, जिसके लिए लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया था, के लिए विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय परिणामों का सारांश
(अनुच्छेद 1.9, 1.14 तथा 1.20 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विद्युत क्षेत्र उपक्रम की गतिविधि और नाम	लेखाओं की अवधि	ब्याज और कर से पहले शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज और कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूंजी	नियोजित पूंजी	कुल मूल्य	संचित लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क.	उत्पादन								
1	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2018-19	1,003.76	209.99	5,462.60	3,051.33	4,422.83	3,212.79	161.46
	उप-योग		1,003.76	209.99	5,462.60	3,051.33	4,422.83	3,212.79	161.46
ख.	प्रसारण								
2	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	2018-19	838.64	196.98	2,154.41	3,520.66	8,601.12	4,011.27	490.61
	उप-योग		838.64	196.98	2,154.41	3,520.66	8,601.12	4,011.27	490.61
ग.	वितरण								
3	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	1,071.56	185.71	14,165.20	12,681.98	-422.44	-2,932.14	-15,614.12
4	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	636.97	95.23	15,036.13	11,178.78	318.56	-2,516.38	-13,695.16
	उप-योग		1,708.53	280.94	29,201.33	23,860.76	-103.88	-5,448.52	-29,309.28
	सकल योग		3,550.93	687.91	36,818.34	30,432.75	12,920.07	1,775.54	-28,657.21

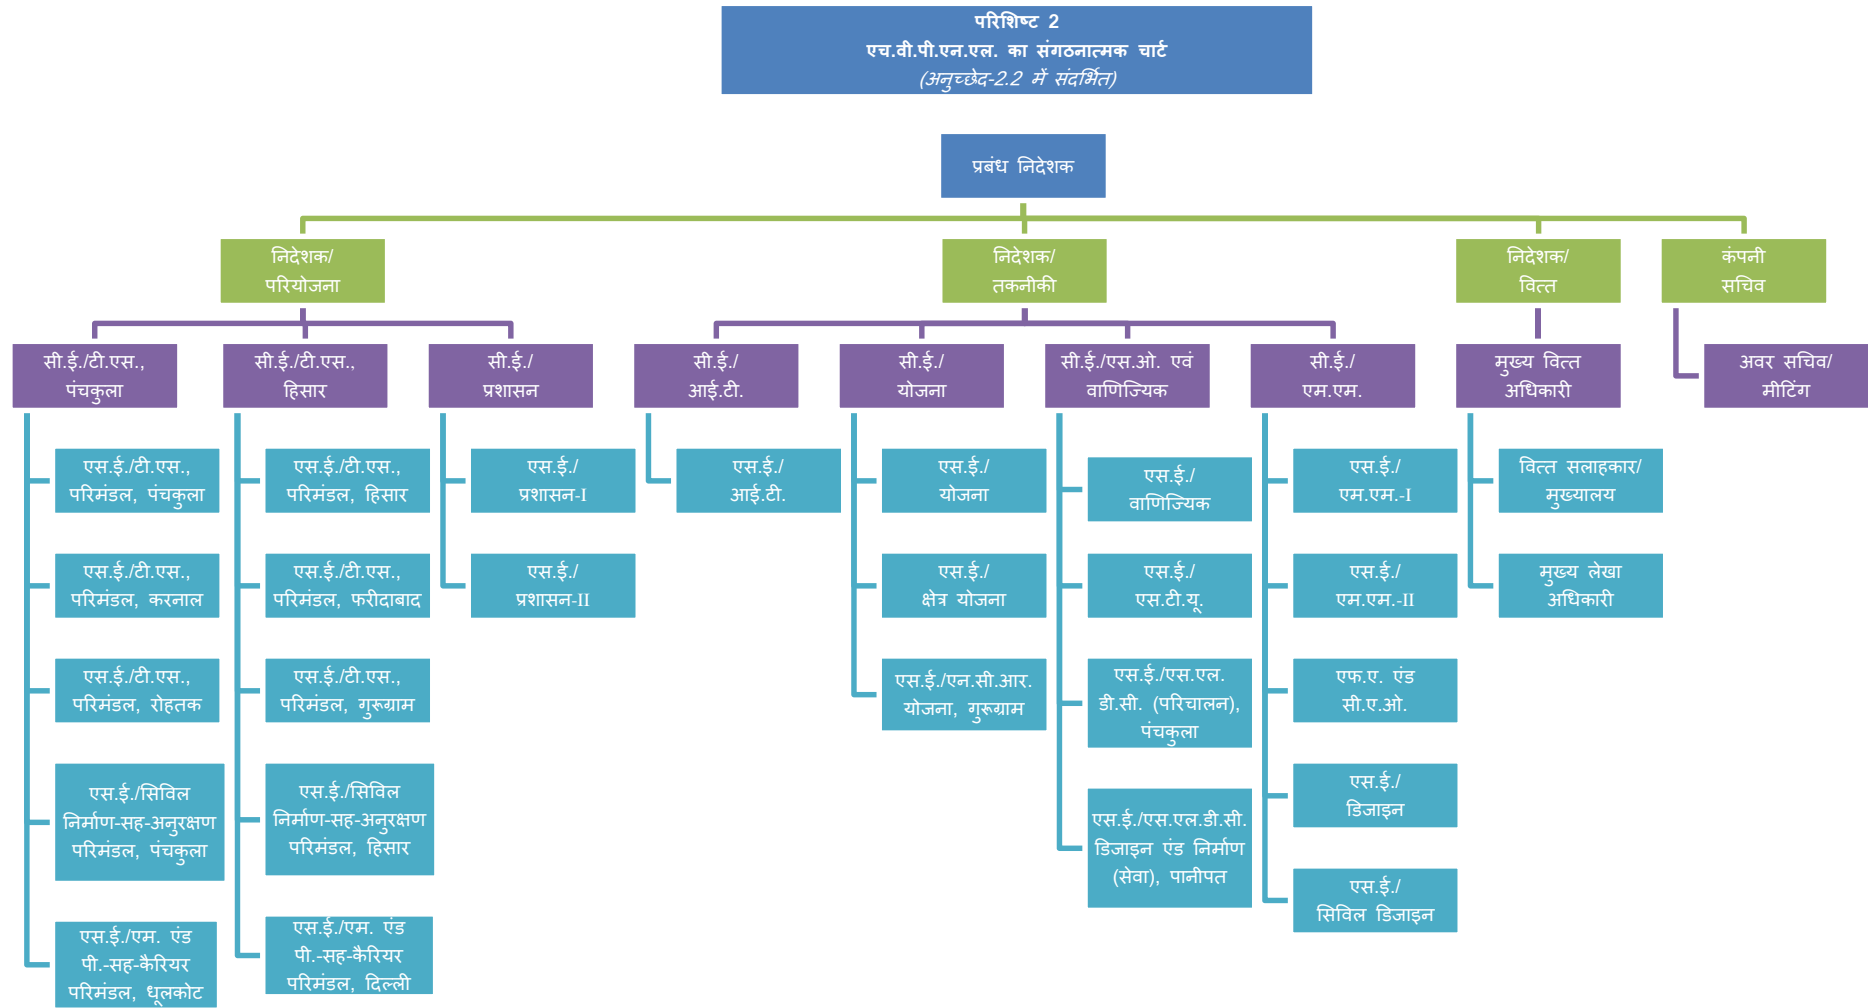

कंपनी के परिचालनों को छः प्रसारण प्रणाली (टी.एस.) परिमंडलों के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है, जो प्रसारण प्रणाली अर्थात् सब-स्टेशनों और प्रसारण लाइनों के संचालन और रखरखाव के लिए उत्तरदायी हैं, एक राज्य लोड डिस्पैच सेंटर (एस.एल.डी.सी.) बिजली प्रणाली की विश्वसनीयता, मितव्ययिता और दक्षता के लिए राज्य में बिजली प्रणाली के एकीकृत परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं, दो सिविल रख-रखाव-सह-निर्माण (सी.एम.सी.) परिमंडल, सिविल कार्यों के रखरखाव और निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं; और पंचकुला में कंपनी के प्रधान कार्यालय में योजना, सामग्री प्रबंधन, वाणिज्यिक और वित्त विंगों के अतिरिक्त सटीक पैमाइश और सब-स्टेशन/लाइनों में सुरक्षा मानकों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए दो पैमाइश और संरक्षण परिमंडल उत्तरदायी हैं।

परिशिष्ट 3

2014-19 के दौरान सब-स्टेशन, लाइनों के निष्पादन में विलंब तथा सब-स्टेशन और संबंधित लाइनों के मध्य असंतुलन दर्शाने वाली विवरणी
(अनुच्छेद 2.7.2.1 में संदर्भित)

क्र. सं.	सब-स्टेशन का नाम	प्रसारण तत्व	योजना विंग के अनुमोदन की तिथि	कार्य प्रदान करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	बैंक चार्ज की तिथि	वास्तविक पूर्णता तिथि	वास्तविक पूर्णता लागत (₹ लाख में)	निर्धारित समय से पूरा होने में देरी (माह में)	6 माह की अनुमतिके बाद प्रदानगी की योजना की मंजूरी से लिया गया समय	योजना बनाने से समग्र विलंब	परिकल्पित लाभ की हानि (₹ लाख में)	सब-स्टेशन और लाइन में असंतुलन (माह में)	असंतुलन के कारण 10.28 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज की हानि (₹ लाख में)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-6	11=4-5	12=10+11	13	14	15	16
1	220 के.वी. सब-स्टेशन, ए-4, फरीदाबाद	सब-स्टेशन	07-03-08	25-05-11	19-10-12	24-11-14	30-12-15	2,500.00	39	33	72	833.11			लाइन संरक्षण को अंतिम रूप देने की प्रारंभिक गतिविधियों को अगस्त 2009 में अनुबंध की प्रदानगी 4 वर्ष बाद सितंबर 2013 में पूरा किया गया था और वन मंजूरी के लिए अनुरोध कार्य शुरू होने के 5 वर्ष बाद (जुलाई 2014) आरंभ किया गया था।
		संबद्ध प्रसारण लाइन	07-03-08	06-08-09	01-12-10	-	30-12-15	1,359.66	62	11	73	720.22	13	214.17	
2	220 के.वी. सब-स्टेशन, हुक्मावाली	सब-स्टेशन	27-09-10	29-02-12	27-06-13	16-06-14	23-04-16	2,500.00	34	11	46	736.02			कंपनी ने ठेकेदार के निराशाजनक निष्पादन के मद्देनजर विशेष खरीद समिति (एस.पी.सी.) की सिफारिश (मार्च 2013) के बाद लाइन अनुबंध को समाप्त करने के लिए (फरवरी 2014) 1 वर्ष का समय लिया। कंपनी फिर से अनुबंध के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई करके समय के भीतर काम पूरा करने की निगरानी करने में विफल रही। कंपनी ने एल.डी. की वसूली के बिना फर्म को भुगतान भी जारी किया (मई से जुलाई 2013), आगे, हालांकि कंपनी ने पांच लाइनों के लिए पूरे अनुबंध के विरुद्ध उपलब्ध बी.जी. को भुनाया (मार्च 2014), अनुबंध की समाप्ति के पांच वर्ष से अधिक समय के बाद भी ₹ 6.02 करोड़ की राशि के एल.डी. को वसूल नहीं किया जा सका और कंपनी के साथ किसी भी वित्तीय कवर के अभाव में इसकी वसूली की संभावना भी दूरस्थ है।
		संबद्ध प्रसारण लाइन	27-09-10	14-03-12	20-07-13		समाप्त किया		0	12	12	0.00	25	471.17	
			27-09-10	01-07-14	28-10-15		24-06-16	985.00	8	40	48	67.51			
3	220 के.वी. सब-स्टेशन, सोंटा	सब-स्टेशन	09-04-10	29-02-12	27-06-13	26-06-14	31-05-16	2,692.13	36	17	53	821.80			कंपनी ने ठेकेदार के निराशाजनक निष्पादन के मद्देनजर विशेष खरीद समिति (एस.पी.सी.) की सिफारिश (मार्च 2013) के बाद अनुबंध को समाप्त करने (फरवरी 2014) के लिए एक वर्ष का समय लिया।
		संबद्ध प्रसारण लाइन	09-04-10	14-03-12	20-07-13	-	समाप्त किया		0	18	18	0.00			
			09-04-10	09-07-14	25-10-15		05-05-16	1,733.73	6	46	52	95.55	23	94.40	
4	66 के.वी. सब-स्टेशन, नान्योला	सब-स्टेशन	09-04-10	29-02-12	27-06-13	11-06-14	03-07-15	551.00	25	17	42	115.80			कंपनी ने ठेकेदार के निराशाजनक निष्पादन के मद्देनजर विशेष खरीद समिति (एस.पी.सी.) की सिफारिश (मार्च 2013) के बाद अनुबंध को समाप्त करने (फरवरी 2014) के लिए एक वर्ष का समय लिया।
		संबद्ध प्रसारण लाइन	09-04-10	14-03-12	20-07-13	-	समाप्त किया		0	18	18	0.00			
			09-04-10	01-07-14	15-07-15		03-07-15	691.00	0	45	45	0.00	13	47.20	

क्र. सं.	सब-स्टेशन का नाम	प्रसारण तत्व	योजना विंग के अनुमोदन की तिथि	कार्य प्रदान करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	बैंक चार्ज की तिथि	वास्तविक पूर्णता तिथि	वास्तविक पूर्णता लागत (₹ लाख में)	निर्धारित समय से पूरा होने में देरी (माह में)	6 माह की अनुमतिके बाद प्रदानगी की योजना की मंजूरी से लिया गया समय	योजना बनाने से समय विलंब	परिकल्पित लाभ की हानि (₹ लाख में)	सब-स्टेशन और लाइन में असंतुलन (माह में)	असंतुलन के कारण 10.28 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज की हानि (₹ लाख में)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-6	11=4-5	12=10+11	13	14	15	16
5	220 के.वी. सब-स्टेशन, सैक्टर-6, सोनीपत	सब-स्टेशन संबद्ध प्रसारण लाइन	09-07-09 09-07-09	03-01-14 07-01-14	02-05-15 02-05-15	- 10-12-16	16-06-17 10-12-16	2,225.00 462.00	26 20	49 49	75 68	493.04 77.57	6	11.87	सब-स्टेशन के निर्माण के लिए कार्य की प्रदानगी में अकारण देरी हुई, जिसके कारण सब-स्टेशनों और लाइनों के पूरा होने में असंतुलन था।
6	220 के.वी. सब-स्टेशन, मीरपुर कुराली	सब-स्टेशन संबद्ध प्रसारण लाइन	04-10-10 04-10-10	03-01-14 14-05-13	02-05-15 01-10-14	- 27-04-16 (बिना भार के प्रभारित)	29-04-17 27-04-16	2,491.00 1,440.20	24 19	34 26	58 45	517.84 236.06	12	111.04	सब-स्टेशन के निर्माण में देरी हुई क्योंकि ठेकेदार ने अनुबंध के अनुसार कार्य अनुसूची का पालन नहीं किया। अनुबंध शुरू करने के 8 माह बाद साइट कार्यालय खोला गया था (नवंबर 2014)। विक्रेता की मंजूरी, जो मई 2014 तक पूरी होनी चाहिए थी, नवंबर 2016 में पूरी हुई। अनुबंध के अनुसार, सभी आपूर्ति फरवरी 2015 तक पूरी होनी थी, हालांकि, ठेकेदार ने फरवरी 2016 में पहला आपूर्ति बिल प्रस्तुत किया। ठेकेदार के निष्पादन के अत्यधिक खराब होने और पी.ई.आर.टी. चार्ट के पीछे रहने के बावजूद, कंपनी ने अनुबंध के अनुसार कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की।
7	220 के.वी. सब-स्टेशन, पिंजौर	सब-स्टेशन संबद्ध प्रसारण लाइन	13-01-10 13-01-10	25-09-13 27-11-15	23-01-15 15-12-16	30-08-17 अपूर्ण मार्च 2019	20-11-17 31-03-19	2,235.00 1,432.13	34 28	39 65	73 93	658.64 341.88	0	0	संबद्ध लाइनें अभी भी अधूरी हैं। तथापि, वैकल्पिक व्यवस्था के साथ सब-स्टेशन को चालू कर दिया गया था।
8	220 के.वी. सब-स्टेशन, सैक्टर-32, पंचकूला	सब-स्टेशन संबद्ध प्रसारण लाइन	13-01-10 13-01-10	25-09-13 27-11-15	23-01-15 15-12-16	24-10-17 अपूर्ण मार्च 2019	22-12-17 31-03-19	2,964.00 651.51	35 28	39 65	75 93	900.56 155.53	0	0	संबद्ध लाइनें अभी भी अधूरी हैं। तथापि, वैकल्पिक व्यवस्था के साथ सब-स्टेशन को चालू कर दिया गया था।
9	132 के.वी. सब-स्टेशन, चंदरखुर्द	सब-स्टेशन संबद्ध प्रसारण लाइन	18-12-08 18-12-08	04-06-10 28-05-10	17-06-11 16-05-11	- -	12-08-14 09-02-15	850.00 388.00	38 46	12 12	50 57	279.62 151.24	6	21.85	कंपनी ने सब-स्टेशन ठेकेदार की खराब प्रगति के बावजूद उसके विरुद्ध प्रारंभिक कार्रवाई नहीं की। एल.डी. की वसूली नवंबर 2011 और मार्च 2012 में दो बार टाल दी गई थी, जो कार्य पूरा नहीं होने के संबंध में इसकी प्रतिबद्धताओं पर निर्भर थी। कंपनी ने पहले ही वसूल किया गया ₹ 1 करोड़ का एल.डी. भी जारी कर दिया
10	132 के.वी. सब-स्टेशन, बारसी	सब-स्टेशन संबद्ध प्रसारण लाइन	15-12-08 15-12-08	04-06-10 28-05-10	17-06-11 16-05-11	- -	29-09-14 23-05-15	921.00 200.00	40 49	12 12	52 61	315.60 83.84	8	39.45	

क्र. सं.	सब-स्टेशन का नाम	प्रसारण तत्व	योजना विंग के अनुमोदन की तिथि	कार्य प्रदान करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	बैंक चार्ज की तिथि	वास्तविक पूर्णता तिथि	वास्तविक पूर्णता लागत (₹ लाख में)	निर्धारित समय से पूरा होने में देरी (माह में)	6 माह की अनुमतिके बाद प्रदानगी की योजना की मंजूरी से लिया गया समय	योजना बनाने से समय विलंब	परिकल्पित लाभ की हानि (₹ लाख में)	सब-स्टेशन और लाइन में असंतुलन (माह में)	असंतुलन के कारण 10.28 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज की हानि (₹ लाख में)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-6	11=4-5	12=10+11	13	14	15	16
11	132 के.वी. सब-स्टेशन, मकरानी	सब-स्टेशन संबद्ध प्रसारण लाइन	18-03-09 18-03-09	04-06-10 26-11-10	17-06-11 20-10-11	-	29-07-16 31-01-13	880.00 140.00	62 16	9 15	71 30	469.66 18.75	43	47.97	(अगस्त 2013)। कंपनी ने अंततः मई 2014 में अनुबंध को समाप्त कर दिया और शेष कार्य को विभागीय रूप से करने का निर्णय लिया (जून 2014), जो कि जुलाई 2016 में 24 माह की देरी से पूरा किया जा सका। ₹ 4.55 करोड़ की जोखिम और लागत राशि भी अप्राप्य रही।
12	132 के.वी. सब-स्टेशन, ताजपुर	सब-स्टेशन संबद्ध प्रसारण लाइन	09-07-09 09-07-09	23-04-13 10-06-13	07-06-14 06-07-14	-	14-05-15 09-12-14	1,217.00 446.00	11 0	40 42	52 42	118.50 0.00	5	7.64	
13	132 के.वी. सब-स्टेशन, खेवड़ा	सब-स्टेशन संबद्ध प्रसारण लाइन	01-07-09 01-07-09	23-04-13 05-01-15	07-06-14 03-02-16	-	18-05-16 29-02-16	1,200.00 4,753.00	24 1	40 61	64 62	243.64 35.29	3	0	
14	66 के.वी. सब-स्टेशन, जमालपुर	सब-स्टेशन संबद्ध प्रसारण लाइन	15-03-13 15-03-13	12-02-14 26-08-16	24-03-15 12-01-18		28-04-18 28-04-18	1,250.00 42.00	38 4	5 36	43 40	403.70 1.27	0	0	वित्तीय बाधाओं के कारण शुरुआत से ही ठेकेदार की प्रगति बहुत खराब थी। हालांकि, कंपनी ने अनुबंध को समाप्त करने के लिए फर्म के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की और ठेकेदार के जोखिम और लागत पर कार्य किया।
15	66 के.वी. सब-स्टेशन, मोहम्मदपुर अहीर	सब-स्टेशन संबद्ध प्रसारण लाइन	15-03-13 15-03-13	12-02-14 30-01-14	24-03-15 28-02-15		06-03-18 14-03-15	1,213.00 430.00	36 0	5 5	41 5	373.40 0	36	121.09	
16	66 के.वी. सब-स्टेशन, माजरी	सब-स्टेशन संबद्ध प्रसारण लाइन	25-03-13 25-03-13	12-02-14 30-01-14	24-03-15 28-02-15	18-03-15	14-06-16 28-03-15	887.00 1,544.00	15 0	5 4	20 4	113.47 0.00	15	158.72	इन सब-स्टेशनों के मामले में बिजली ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति एच.वी.पी.एन.एल. द्वारा की जानी थी। हालांकि, कंपनी समय पर ठेकेदार को बिजली ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति करने में विफल रही और इसके परिणामस्वरूप इन सब-स्टेशनों के कार्यों में देरी हुई।
17	66 के.वी. सब-स्टेशन, सरदाहेड़ी	सब-स्टेशन संबद्ध प्रसारण लाइन	01-04-13 01-04-13	12-02-14 30-01-14	24-03-15 28-02-15		15-07-16 08-03-15	749.00 365.00	16 0	5 4	21 4	102.45 0.83	17	43.78	
18	66 के.वी. सब-स्टेशन, पिलखनी	सब-स्टेशन संबद्ध प्रसारण लाइन	14-05-13 14-05-13	12-02-14 30-01-14	24-03-15 28-02-15		13-08-16 18-04-15	837 707	17 2	3 3	20 4	121.42 9.89	16	78.74	

सा.क्षे.उ. (सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों) पर वर्ष 2020 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 2

क्र. सं.	सब-स्टेशन का नाम	प्रसारण तत्व	योजना विंग के अनुमोदन की तिथि	कार्य प्रदान करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	बैंक चार्ज की तिथि	वास्तविक पूर्णता तिथि	वास्तविक पूर्णता लागत (₹ लाख में)	निर्धारित समय से पूरा होने में देरी (माह में)	6 माह की अनुमतिके बाद प्रदानगी की योजना की मंजूरी से लिया गया समय	योजना बनाने से समय विलंब	परिकल्पित लाभ की हानि (₹ लाख में)	सब-स्टेशन और लाइन में असंतुलन (माह में)	असंतुलन के कारण 10.28 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज की हानि (₹ लाख में)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-6	11=4-5	12=10+11	13	14	15	16
19	132 के.वी. सब-स्टेशन, भंडेरी	सब-स्टेशन	03-05-12	01-11-13	30-06-14		28-06-14	1,107.00	0	12	12	0.00	0	0	
		संबद्ध प्रसारण लाइन	03-05-12	14-05-13	03-07-14		28-06-14	323.00	0	7	6	0.00			
20	66 के.वी. सब-स्टेशन, रूंदी	सब-स्टेशन	18-08-09	06-12-12	07-09-13		06-11-14	580.00	0	34	34	0.00			
		संबद्ध प्रसारण लाइन	18-08-09	07-03-11	04-02-12		30-12-14	25.00	35	13	48	7.57	2	0	
21	66 के.वी. सब-स्टेशन, सैक्टर-4, गुडगांव	सब-स्टेशन	25-08-10	02-09-13	30-12-14		25-11-15	1,300.00	11	31	42	122.50	0	0	
		संबद्ध प्रसारण लाइन	25-08-10	20-09-13	31-03-15		16-11-15	743.00	8	31	39	48.80			
22	66 के.वी. सब-स्टेशन, लाहा, पंचकूला	सब-स्टेशन	12-12-11	01-11-13	31-10-14		31-08-15	848.00	10	17	27	73.61	12	5.40	पूर्व-बोली गतिविधियों के पूरा न होने के कारण सब-स्टेशन के कार्य में देरी हुई। मार्च 2014 में जी.ई.एल.ओ. की संशोधित मंजूरी पर 4 माह से अधिक समय के बाद 14 मार्च 2014 को स्पष्ट साइट उपलब्ध कराई जा सकी और जनवरी 2015 में साइट से एच पोल और पेड़ को हटाने से देरी हुई। प्रारंभिक गतिविधि के विलंबित होने से परियोजना के पूरा होने में देरी हुई।
		संबद्ध प्रसारण लाइन	12-12-11	25-09-13	20-10-14		03-09-14	70.00	0	16	16	0.00			
23	132 के.वी. सब-स्टेशन, उरलाना, पानीपत	सब-स्टेशन	05-10-12	01-11-13	31-10-14		22-12-15	1,200.00	14	7	21	142.89	13	59.97	
		संबद्ध प्रसारण लाइन	05-10-12	25-09-13	20-10-14		26-11-14	700.00	1	6	7	7.40			
24	66 के.वी. सब-स्टेशन, सैक्टर-20, पंचकूला	सब-स्टेशन	15-11-12	01-11-13	03-11-14		30-12-15	1,352.00	14	6	20	162.92	7	11.48	
		संबद्ध प्रसारण लाइन	15-11-12	10-07-14	24-01-15	30-05-2015	25-12-15	335.00	11	14	25	32.05			
25	132 के.वी. सब-स्टेशन, भट्टू सोडर	सब-स्टेशन	21-09-10	04-05-12	12-06-13		26-03-16	690.00	34	14	48	200.58	0	0	
		संबद्ध प्रसारण लाइन	21-09-10	15-06-12	28-08-13		13-03-16	454.00	31	15	46	120.31			

क्र. सं.	सब-स्टेशन का नाम	प्रसारण तत्व	योजना विंग के अनुमोदन की तिथि	कार्य प्रदान करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	बैंक चार्ज की तिथि	वास्तविक पूर्णता तिथि	वास्तविक पूर्णता लागत (₹ लाख में)	निर्धारित समय से पूरा होने में देरी (माह में)	6 माह की अनुमतिका बाद प्रदानगी की योजना की मंजूरी से लिया गया समय	योजना बनाने से समय विलंब	परिकल्पित लाभ की हानि (₹ लाख में)	सब-स्टेशन और लाइन में असंतुलन (माह में)	असंतुलन के कारण 10.28 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज की हानि (₹ लाख में)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-6	11=4-5	12=10+11	13	14	15	16
26	220 के.वी. सब-स्टेशन, पंचगांव	सब-स्टेशन	14-08-12	17-02-14	15-05-15		18-07-17	4,320.00	27	12	39	980.71	34	45.41	शुरुआत से ही ठेकेदार की प्रगति बहुत खराब थी। हालांकि, कंपनी ने अनुबंध को समाप्त करने के लिए फर्म के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की और ठेकेदार के जोखिम और लागत पर कार्य किया।
		संबद्ध प्रसारण लाइन	14-08-12	15-05-13	01-10-14		01-10-14	171.00	0	3	3	0.00			
27	220 के.वी. सब-स्टेशन, सैक्टर 33, गुडगांव	सब-स्टेशन	16-11-10	28-02-14	04-06-15		20-07-17	4,264.00	26	34	60	946.08	27	226.16	कंपनी ने अनुबंध के प्रावधानों को लागू नहीं किया, हालांकि ठेकेदार का निष्पादन स्थापना के बाद से ही खराब था और निर्धारित पूर्णता अवधि (जून 2015) तक इसने केवल 24 प्रतिशत सिविल कार्य और 35 प्रतिशत सामग्री की आपूर्ति पूरी की। जनशक्ति की विलंबित आपूर्ति एवं जनशक्ति की अपर्याप्त गतिशीलता और ठेकेदार की वित्तीय कमी, धीमी कार्य प्रगति के मुख्य कारण थे। यह भी देखा गया था कि मार्च 2016 में, कंपनी ने न केवल मई 2016 तक 90 प्रतिशत एल.डी. की वसूली को स्थगित कर दिया, बल्कि मई 2016 तक कार्य पूरा करने के ठेकेदार के आश्वासन पर पहले से ही वसूल किए गए (मार्च 2016 और मई 2016) ₹ 3.97 करोड़ के एल.डी. को वापस कर दिया। चूंकि ठेकेदार उपर्युक्त निर्धारित तिथि तक कार्य पूरा नहीं कर सका, कंपनी ने सितंबर 2016 तक फिर से 60 प्रतिशत एल.डी. की वसूली और फिर नवंबर 2016 में दिसंबर 2016 तक 90 प्रतिशत एल.डी. की वसूली को स्थगित करके ठेकेदार को जमानत दे दी। इसके अतिरिक्त, जुलाई 2017 में चालू किए गए सब-स्टेशन को कंपनी के संबंधित टी.एस. परिमंडल द्वारा जारी किए जाने वाले उपभोग विवरण और पूर्णता प्रमाण-पत्र के अभाव में मार्च 2019 तक कैपिटल नहीं किया जा सका।
		संबद्ध प्रसारण लाइन	16-11-10	31-01-14	30-04-15		30-04-15	1,200.00	0	33	33	0.00			

सा.क्षे.उ. (सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों) पर वर्ष 2020 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 2

क्र. सं.	सब-स्टेशन का नाम	प्रसारण तत्व	योजना विंग के अनुमोदन की तिथि	कार्य प्रदान करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	बैंक चार्ज की तिथि	वास्तविक पूर्णता तिथि	वास्तविक पूर्णता लागत (₹ लाख में)	निर्धारित समय से पूरा होने में देरी (माह में)	6 माह की अनुमतिके बाद प्रदानगी की योजना की मंजूरी से लिया गया समय	योजना बनाने से समय विलंब	परिकल्पित लाभ की हानि (₹ लाख में)	सब-स्टेशन और लाइन में असंतुलन (माह में)	असंतुलन के कारण 10.28 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज की हानि (₹ लाख में)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8-6	11=4-5	12=10+11	13	14	15	16
28	220 के.वी. सब-स्टेशन, सैक्टर 20, गुडगांव	सब-स्टेशन संबद्ध प्रसारण लाइन	14-05-08 14-05-08	14-01-13 19-05-09	31-07-14 12-09-10		29-05-17 31-01-15	6,208.00 5,233.00	34 53	51 6	85 60	1,831.23 2,393.89	28	1,120.73	
29	220 के.वी. सब-स्टेशन, आर.जी.ई.सी. सोनीपत	सब-स्टेशन संबद्ध प्रसारण लाइन	20-05-11 20-05-11	03-10-13 13-03-12	28-02-15 12-03-13		05-02-19 29-02-16	3,500.00 4,753.00	48 36	23 4	71 40	1,437.20 1,471.25	36	1,343.67	आर.ई.जी.ई.सी. का प्रस्तावित भार 66 के.वी./33 के.वी. लेवल पर अप्रयुक्त रूप से पूरी क्षमता के रूप में नहीं आया।
30	220 के.वी. जी.आई.एस. सब-स्टेशन, बरही	सब-स्टेशन संबद्ध प्रसारण लाइन	09-07-09 31-07-12	07-10-13 14-05-13	31-12-14 31-07-14		16-02-19 14-07-17	3,500.00 505.00	50 36	46 4	96 40	1,507.16 155.60	19	69.22	
31	66 के.वी. सब-स्टेशन, हसनपुर खादर	सब-स्टेशन संबद्ध प्रसारण लाइन	31-03-14 31-03-14	20-02-17 27-11-17	20-06-18 30-08-18		29-03-19 10-03-19	930.00 539.00	9 6	29 39	39 45	74.89 29.55	1	0	
32	220 के.वी. सब-स्टेशन, सैक्टर-57, गुडगांव	सब-स्टेशन संबद्ध प्रसारण लाइन	30-06-08 30-06-08	07-10-13 19-05-09	31-12-14 10-09-10		14-04-18 29-02-12	4,184 52	40 18	58 5	98 23	1,433.72 7.97	75	32.07	
कुल								95,018.36				22,801.58		4,383.20	
													27,184.78		

परिशिष्ट 4

2018-19 तक पाँच वर्षों के लिए हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के वित्तीय स्थिति और कार्यचालन परिणाम
(अनुच्छेद 2.10.1 में संदर्भित)

क. वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
I. इक्विटी और देयताएं					
क. इक्विटी					
अन्य इक्विटी सहित इक्विटी शेयर पूंजी	2,368.38	2,721.24	3,054.45	3,479.80	4,310.31
ख. देयताएं					
गैर-वर्तमान देयताएं	6,370.9	6,238.5	5,882.78	5,411.80	5,450.15
वर्तमान देयताएं	1,154.24	1,267.11	1,499.35	1,860.22	1,208.32
कुल (I)	9,893.52	10,226.85	10,436.58	10,751.82	10,968.78
II. परिसंपत्तियां					
क. गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां					
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (सी.डब्ल्यू.आई.पी. सहित)	6,400.6	6,526.87	6,611.16	6,580.33	7,107.04
वित्तीय परिसंपत्तियां *	2,792.57	2,842.93	2,913.53	3,018.91	2,926.48
अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	114.72	82.73	87.62	70.96	64.27
ख. वर्तमान परिसंपत्तियां					
मांग सूची	102.3	76.97	92.05	105.61	73.99
वित्तीय परिसंपत्तियां #	251.98	365.05	250.35	485.20	429.10
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	231.35	332.3	481.87	490.81	367.90
कुल (II)	9,893.52	10,226.85	10,436.58	10,751.82	10,968.78
ऋण/इक्विटी अनुपात	2.69	2.29	1.93	1.56	1.26
निवल मूल्य	2,550.10	2,736.85	2,839.51	3,222.98	4,011.27
नियोजित पूंजी	8,518.28	8,321.99	8,016.94	7,768.36	8,409.55
कर देने से पूर्व लाभ	-8.42	316.12	381.23	534.25	457.13
ब्याज और वित्त प्रभार	476.46	521.79	476.2	430.58	381.51
कुल रिटर्न	468.04	837.91	857.43	964.83	838.64
नियोजित पूंजी पर रिटर्न की प्रतिशतता	5.49	10.07	10.70	12.42	9.97

* वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश, व्यापार प्राप्य, ऋण और अन्य वित्तीय संपत्तियां शामिल हैं।

वर्तमान निवेश, व्यापार प्राप्य, नकद और नकद समतुल्य बैंक शेष, ऋण और अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ शामिल हैं।

ख. कार्यचालन परिणाम

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
I. राजस्व					
परिचालन से राजस्व	1,377.61	1,697.46	1,698.23	2,006.57	2,154.41
अन्य आय	111.67	193.03	231.51	268.88	198.28
कुल राजस्व	1,489.28	1,890.49	1,929.74	2,275.45	2,352.69
II. व्यय					
क. नियत लागत					
कर्मचारी लाभ व्यय	433.62	465.31	480.63	620.17	636.37
वित्त लागत	476.45	521.79	476.2	430.58	381.51
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	272.29	340.04	369.97	382.93	397.79
कुल नियत लागत	1,182.36	1,327.14	1,326.8	1,433.68	1,415.67
ख. परिवर्तनीय व्यय					
विद्युत उत्पादन*	218.13	-	-	-	-
अन्य व्यय	97.21	247.24	221.71	307.52	479.90
कुल परिवर्तनीय व्यय	315.34	247.24	221.71	307.52	479.90
कुल व्यय	1,497.7	1,574.38	1,548.51	1,741.2	1,895.57
कर से पहले लाभ और हानि	-8.42	316.11	381.23	534.25	457.12
कर खर्च	0	67.71	81.36	114.02	98.50
कर के बाद लाभ और हानि	-8.42	248.4	299.87	420.23	358.62
प्रेषित निवल विद्युत (एम.यू. में)	45,260.42	46,580.35	48,042.08	49,721.78	50,456.03
वसूली (₹ प्रति इकाई)	0.304	0.364	0.353	0.404	0.427
नियत लागत (₹ प्रति इकाई)	0.261	0.285	0.276	0.288	0.281
परिवर्तनीय लागत (₹ प्रति इकाई)	0.070	0.053	0.046	0.062	0.095
कुल लागत (₹ प्रति इकाई)	0.331	0.338	0.322	0.350	0.376
अंशदान (₹ प्रति इकाई)	0.235	0.311	0.307	0.342	0.332
लाभ (+)/हानि (-) (₹ प्रति इकाई)	-0.027	0.026	0.031	0.054	0.051

* उत्पादन लागत को 2015-19 की अवधि के दौरान अन्य खर्चों में शामिल किया गया है।

परिशिष्ट 5

31 मार्च 2019 को राज्य सा.क्षे उ. (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) से संबंधित इक्विटी और बकाया ऋण की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी

(अनुच्छेद 4.3 तथा 4.25 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सा.क्षे.उ. का क्षेत्र और नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह और वर्ष	वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर इक्विटी				वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर बकाया दीर्घकालिक ऋण			
				हरियाणा सरकार	भारत सरकार	अन्य	कुल	हरियाणा सरकार	भारत सरकार	अन्य	कुल
1	2	3	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
क	सामाजिक क्षेत्र										
	I. कार्यरत सरकारी कंपनियां										
1	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	02-जनवरी-71	26.14	23.92	0	50.06	0	0	10.91	10.91
2	हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण	10-दिसंबर-80	45.14			45.14	0	0	77.11	77.11
3	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	महिला एवं बाल विकास	31-मार्च-82	15.51	1.1	0	16.61	0	0	0	0
4	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	कृषि एवं किसान कल्याण विकास हरियाणा	12-सितंबर-74	2.76	1.13	1.11	5	0	0	0	0
5	हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा	27-मार्च-74	1.37	0	0.2	1.57	0	0	0	0
6	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा	30-मार्च-67	2.54	1.6	0	4.14	0	0	16.56	16.56
कुल क-I				93.46	27.75	1.31	122.52	0	0	104.58	104.58
	II. सांविधिक निगम										
7	हरियाणा राज्य भण्डारण निगम	कृषि	01-नवंबर-67	2.92	2.92		5.84	8.15		69.4	77.55
कुल क-II				2.92	2.92	0	5.84	8.15	0	69.4	77.55
	III. अकार्यरत सरकारी कंपनियां										
8	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड	कृषि	09-जनवरी-70	10.89	0	0	10.89	0			0

क्र. सं.	सा.क्षे.उ. का क्षेत्र और नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह और वर्ष	वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर इक्विटी				वर्ष 2018-19की समाप्ति पर बकाया दीर्घकालिक ऋण			
				हरियाणा सरकार	भारत सरकार	अन्य	कुल	हरियाणा सरकार	भारत सरकार	अन्य	कुल
1	2	3	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
9	हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड	उद्योग	19-जून-00	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल क-III				10.89	0	0	10.89	0	0	0	0
कुल क (I+II+III)				107.27	30.67	1.31	139.25	8.15	0	173.98	182.13
ख	प्रतिस्पर्धी माहौल में सा.क्षे.उ.										
	I. कार्यरत सरकारी कंपनियां										
10	हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	वन	07-दिसंबर-89	0.2		0	0.2			0	0
11	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	08-मार्च-67	48.86		0	48.86			5,501.72	5,501.72
12	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.)	13-मई-99	122.04		0	122.04			0	0
13	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	पर्यटन एवं लोक संपर्क	01-मई-74	34.07		0	34.07			0	0
14	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	इलेक्ट्रॉनिक्स	15-मई-82	9.9		0	9.9			0	0
15	हारटोन इन्फोमेटिक्स लिमिटेड	इलेक्ट्रॉनिक्स	08-मार्च-95	0		0.5	0.5			0	0
16	गुडगांव प्रौद्योगिकी पार्क लिमिटेड	नगर एवं ग्राम आयोजना	14-फरवरी-96	0		14.72	14.72			0	0
17	पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड	उद्योग	27-दिसंबर-16	0		0.1	0.1			0	0
18	फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	नगर एवं ग्राम आयोजना	30-सितंबर-16	0.05		0.05	0.1			0	0
19	गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड	नगर एवं ग्राम आयोजना	05-सितंबर-17	0		50	50			0	0
कुल ख-I				215.12		65.37	280.49			5,501.72	5,501.72
	II. सांवाधिक निगम										
20	हरियाणा वित्तीय निगम	उद्योग	01-अप्रैल-67	202.01	-	5.65	207.66	0	0	0	0
कुल ख-II				202.01	0	5.65	207.66	0	0	0	0

क्र. सं.	सा.क्षे.उ. का क्षेत्र और नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह और वर्ष	वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर इक्विटी				वर्ष 2018-19की समाप्ति पर बकाया दीर्घकालिक ऋण			
				हरियाणा सरकार	भारत सरकार	अन्य	कुल	हरियाणा सरकार	भारत सरकार	अन्य	कुल
1	2	3	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	5(घ)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
III. अकार्यरत सरकारी कंपनियाँ											
21	हरियाणा कंकास्ट लिमिटेड	उद्योग	29-नवंबर-73	2.9	0	3.95	6.85	1.39	0	2.3	3.69
22	हरियाणा खनिज लिमिटेड	खदान एवं भू-विज्ञान	02-दिसंबर-72	0	0	0.24	0.24	0	0	0	0
कुल ख-III				2.9	0	4.19	7.09	1.39	0	2.3	3.69
कुल ख (I+II+III)				420.03	0	75.21	495.24	1.39	0	5,504.02	5,505.41
ग	अन्य										
23	हरियाणा चिकित्सा सेवाएं निगम लिमिटेड	स्वास्थ्य	05-जून-14	5	0	0	5	0	0	0	0
24	हरियाणा परिवहन अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड	परिवहन	27-नवंबर-87	6.75	0	0	6.75	0	0	0	0
25	हरियाणा रेल मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.)	22-अगस्त-17	10.2	14.7	0	24.9	0	0	0	0
26	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	गृह	29-दिसंबर-89	25	0	0	25	0	0	390.5	390.5
27	हरियाणा मास रेपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	उद्योग	24-मार्च-12	14.4	0	13.84	28.24	0	0	0	0
कुल ग				61.35	14.7	13.84	89.89	0	0	390.5	390.5
कुल क+ख+ग				588.65	45.37	90.36	724.38	9.54	0	6,068.5	6,078.04

परिशिष्ट 6

31 मार्च 2019 को इक्विटी, ऋणों और गारंटी के शेषों के संबंध में हरियाणा सरकार के वित्त लेखाओं और राज्य सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखाओं के मध्य अंतर को दर्शाने वाली विवरणी

(अनुच्छेद 4.7 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सा.क्षे.उ. का नाम	हरियाणा सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			राज्य सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार			अंतर		
		प्रदत्त पूंजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी	प्रदत्त पूंजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी	प्रदत्त पूंजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	2.54	18.3	3.72	2.54	0	0	0	18.3	3.72
2	हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड	1.37	0.73	0	1.37	0	0	0	0.73	0
3	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	2.75	0.21	0	2.76	0	0	-0.01	0.21	0
4	हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	0.2	0	0	0.2	0	0	0	0	0
5	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	33.85	0.38	10.91	26.14	0	10.91	7.71	0.38	0
6	हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	45.56	0	77.06	45.14	0	77.11	0.42	0	-0.05
7	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	14.86	0	0	15.51	0	0	-0.65	0	0
8	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	76.14	0	3351.93	48.86	0	3351.93	27.28	0	0
9	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	69.82	0	390.5	25.00	0	850	44.82	0	-459.5
10	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	70.12	0	0	122.04	0	0	-51.92	0	0
11	हरियाणा रेल मूलभूत संरचना लिमिटेड	0	0	0	10.2	0	0	-10.20	0	0
12	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	0	0	0	34.07	0	0	-34.07	0	0
13	हरियाणा परिवहन अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड	8.31	0	0	6.75	0	0	1.56	0	0
14	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	9.9	0	0	9.9	0	0	0	0	0

क्र.सं.	सा.क्षे.उ. का नाम	हरियाणा सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			राज्य सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार			अंतर		
		प्रदत्त पूंजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी	प्रदत्त पूंजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी	प्रदत्त पूंजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	हारट्रोन इन्फोमेटिक्स लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	गुड़गांव प्रौद्योगिकी पार्क लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	हरियाणा मास रेपिड ट्रांसपोर्ट कापरिशन लिमिटेड	0	0	0	14.4	0	0	-14.4	0	0
18	हरियाणा चिकित्सा सेवाएं निगम लिमिटेड	0	0	0	5.00	0	0	-5.00	0	0
19	हरियाणा राज्य भण्डारण निगम	2.92	8.15	69.4	2.92	8.15	69.4	0	0	0
20	हरियाणा वित्तीय निगम	204.22	0	0	202.01	0	0	2.21	0	0
21	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम	10.89	176.31	0	10.89	0	0	0	176.31	0
22	हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	हरियाणा कंकास्ट लिमिटेड	0	0	0	2.9	1.39	0	-2.9	-1.39	0
24	हरियाणा खनिज लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0	0	0	0.05	0	0	-0.05	0	0
27	गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल		553.45	204.08	3903.52	588.65	9.54	4359.35	-35.20	194.54	-455.83

परिशिष्ट 7

कार्यरत राज्य सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त), जिनके लेखे बकाया हैं, में राज्य सरकार के निवेश की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी

(अनुच्छेद 4.8.1 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	जिस वर्ष तक लेखाओं को अंतिमकृत किया गया	अवधि जिसके लेखे बकाया हैं	अंतिमकृत नवीनतम लेखाओं के अनुसार प्रदत्त पूंजी	वर्ष, जिसके लेखे बकाया हैं, के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश			
					इक्विटी	ऋण	अनुदान	अन्यों को निर्दिष्ट (सब्सिडी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क कार्यरत सरकारी कंपनियां								
1	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16 2016-17 2017-18 2018-19	48.11 0 0 0	1 0 0 0			6.75 80.27 18.49 10.94
2	हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	2013-14	2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19	22.47 0 0 0 0	1.25 13.24 2.17 2.5 2.27			3.5 3.5 44.44 5.25 8.25
3	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17 2017-18 2018-19	16.61 0 0	0 0 0		2.1	2.5 6.8 2.8
4	हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	1.56	0			4.32
5	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	48.85	0.01		83.47	
6	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	30.92	3.15		17.82	
7	हरियाणा पुलिस आवास निगम	2014-15	2015-16 2016-17 2017-18 2018-19	25 0 0 0	0 0 0 0		72.46 77.03 90.09 162.84	
8	हरियाणा मास रेपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	2017-18	2018-19	1	13.89		0	
कुल क (कार्यरत सरकारी कंपनियां)				194.52	39.48	0	505.81	197.81
ख कार्यरत सांविधिक निगम								
1	हरियाणा राज्य भंडारण निगम	2017-18	2018-19	5.84		8.15		
कुल ख (कार्यरत सांविधिक निगम)				5.84	0	8.15	0	0
कुल योग (क + ख)				200.36	39.48	8.15	505.81	197.81

परिशिष्ट 8

नवीनतम वर्ष, जिसके लिए लेखाओं को अंतिमकृत किया गया था, के लिए राज्य सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के सारांशिक वित्तीय परिणाम

(अनुच्छेद 4.11, 4.13, 4.18 तथा 4.19 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सा.क्षे.उ. का क्षेत्र, प्रकार और नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे अन्तिम किए गए	लाभांश, ब्याज और कर से पहले शुद्ध लाभ/हानि	लाभांश, ब्याज और कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूंजी	नियोजित पूंजी	कुल मूल्य	संचित लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क	सामाजिक क्षेत्र									
	I. कार्यरत सरकारी कंपनियां									
1	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड #	2014-15	2018-19	0.93	0.73	1.3	48.11	61.42	57.05	8.94
2	हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड #	2013-14	2017-18	0.68	-0.79	3.57	22.47	37.63	9.71	-12.76
3	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2019-20	-0.57	-0.57	3.04	16.61	15.11	15.11	-2.37
		2015-16	2019-20	0.14	0.14	3.82	16.61	15.25	15.25	-2.23
4	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	2.7	-0.42	106.94	5	5.79	5.79	0.79
		2018-19	2019-20	10.4	4.8	143.23	5	10.06	10.06	5.06
5	हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	-0.84	-1.19	87.3	1.56	6.52	6.52	4.96
6	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड #	2015-16	2018-19	87.94	0.92	2,131.60	4.14	-98.67	-117.71	-121.85
कुल क-I				99.25	4.61	2,370.82	97.89	32.21	-19.12	-117.88
	II. सांविधिक निगम									
7	हरियाणा राज्य भण्डारण निगम	2017-18	2018-19	92.31	46.87	121.62	5.84	80.99	4.91	0
कुल क-II				92.31	46.87	121.62	5.84	80.99	4.91	0
	III. अकार्यरत सरकारी कंपनियां									
8	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड	2017-18	2019-20	-0.05	-0.05	0	10.89	-343.44	-343.44	-354.33

क्र. सं.	सा.क्षे.उ. का क्षेत्र, प्रकार और नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे अन्तिम किए गए	लाभांश, ब्याज और कर से पहले शुद्ध लाभ/हानि	लाभांश, ब्याज और कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूंजी	नियोजित पूंजी	कुल मूल्य	संचित लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड ^	31 अगस्त 2001 को समाप्त	2003-04	0	0	0	0	0	0	0
कुल क-III				-0.05	-0.05	0	10.89	-343.44	-343.44	-354.33
कुल क (I+II+III)				191.51	51.43	2,492.44	114.62	-230.24	-357.65	-472.21
ख. सांविधिक निगम										
प्रतिस्पर्धी माहौल में सा.क्षे.उ.										
I. कार्यरत सरकारी कंपनियां										
10	हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2019-20	0.86	0.62	34.99	0.2	48.9	48.9	48.7
11	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2019-20	962.25	216.34	1,563.68	48.84	7,268.51	1,631.10	1,482.82
12	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	26.97	17.74	1.8	122.04	232.43	232.43	110.39
13	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	2015-16	2018-19	1.52	1.09	255.95	28.06	56.61	56.61	28.55
		2016-17	2019-20	-5.84	-5.39	270.55	29.79	52.95	52.95	23.16
		2017-18	2019-20	-14.37	-14.3	270.94	30.92	39.78	39.78	8.86
14	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2019-20	16.12	9.55	37.51	9.9	89.47	89.47	79.59
15	हारटोन इन्फोर्मेटिक्स लिमिटेड ^	2017-18	2018-19	1.08	0.77	1.11	0.5	4.85	4.85	4.35
16	गुडगांव प्रौद्योगिकी पार्क लिमिटेड ^	2017-18	2018-19	4.45	3.42	0.69	14.72	34.02	34.02	18.25
		2018-19	2019-20	2.2	1.41	1.86	14.72	35.43	35.43	19.66
17	पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड ^	2018-19	2019-20	-0.01	-0.01	0	0.1	0.09	0.09	-0.01
18	फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2016-17	2018-19	-0.04	-0.03	0	0.10	0.07	0.07	-0.03
		2017-18	2018-19	-1.18	-1.19	0	0.1	0.1	0.1	0
19	गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड ^	2017-18	2018-19	0.06	0.05	0	50	50.05	50.05	0.05

क्र. सं.	सा.क्षे.उ. का क्षेत्र, प्रकार और नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे अन्तिम किए गए	लाभांश, ब्याज और कर से पहले शुद्ध लाभ/हानि	लाभांश, ब्याज और कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूंजी	नियोजित पूंजी	कुल मूल्य	संचित लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	कुल ख-I			993.98	230.98	1,911.89	277.32	7,769.61	2,132.2	1,754.41
II. सांविधिक निगम										
20	हरियाणा वित्तीय निगम	2017-18	2018-19	-4.38	-4.45	1.39	207.66	94.15	94.15	-113.51
	कुल ख-II			-4.38	-4.45	1.39	207.66	94.15	94.15	-113.51
III. अकार्यरत सरकारी कंपनियां										
21	हरियाणा कंक्रेट लिमिटेड	1997-98	1998-99	-7.97	-7.97	0	6.85	-16.64	-20.33	-27.18
22	हरियाणा खनिज लिमिटेड ^	2017-18	2018-19	-0.09	-0.09	0	0.24	-4.84	-4.84	-7.64
	कुल ख-III			-8.06	-8.06	0	7.09	-21.48	-25.17	-34.82
	कुल ख-(I+II+III)			981.54	218.47	1,913.28	492.07	7,842.28	2,201.18	1,606.08
ग	अन्य									
I. कार्यरत सरकारी कंपनियां										
23	हरियाणा चिकित्सा सेवाएं निगम लिमिटेड #	2015-16	2018-19	1.39	1.27	3.09	5	4.77	4.77	-0.23
24	हरियाणा परिवहन अभियान्त्रिकी निगम लिमिटेड	2016-17	2018-19	-2.08	-2.85	44.73	6.6	21.77	21.77	15.17
		2017-18		5.08	2.54	55.22	6.65	24.35	24.35	17.7
25	हरियाणा रेल मूलभूत संरचना लिमिटेड	2018-19	2019-20	0.04	0.03	0	20	19.91	19.91	-0.09
26	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2014-15	2018-19	25.9	0.59	72.75	25	249.31	23.86	-1.14
27	हरियाणा मास रेपिड ट्रांसपोर्ट कापरिशन लिमिटेड	2017-18	2018-19	0.27	0.26	0	1	1.23	1.23	0.23
	कुल ग			32.68	4.69	131.06	57.65	299.57	74.12	16.47
	कुल (क+ख+ग)			1,205.73	274.59	4,536.78	664.34	7,911.61	1,917.65	1,150.34

अक्टूबर 2018 से सितंबर 2019 के दौरान चार कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (क्रम संख्या 1, 2, 6 और 23) ने कोई लेखा नहीं जमा किया। इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का विवरण पिछले वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार है।

^ (क्रम संख्या 9, 15, 16, 17, 19 और 22) छः सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का संदर्भ देता है जहां राज्य सरकार के अतिरिक्त अन्य द्वारा निवेश किया गया है।

परिशिष्ट 9

ऐतिहासिक लागत के आधार पर इक्विटी के रूप में राज्य सरकार के निवेश की सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम वार स्थिति

(अनुच्छेद 4.16 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कंपनी का नाम	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
क. सामाजिक क्षेत्र																					
1	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	0	28.17	28.67	29.17	15.69	15.94	17.13	18.64	20.29	21.69	23.49	25.14	25.14	25.14	25.14	25.14	26.15	26.14	26.14	26.14
2	हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	7.91	8.31	8.51	8.96	9.46	9.96	11.16	12.66	13.66	16.07	17.58	19.52	20.52	21.52	22.77	24.97	38.2	40.37	42.87	45.14
3	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	3.85	4.1	4.15	4.65	5	6.2	9.34	12.48	14.81	15.51	15.51	16.61	16.61	15.51	15.51	15.51	15.51	15.51	15.51	15.51
4	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	2.76	2.76	2.76	2.9	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76
5	हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड	1.37	1.37	1.37	1.56	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.36	1.36	1.37	1.37	1.37
6	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54
7	हरियाणा भण्डारण निगम	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92

क्र. सं.	कंपनी का नाम	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
8	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89	10.89
	कुल क	32.24	61.06	61.81	63.59	50.63	52.58	58.11	64.26	69.24	73.75	77.06	81.75	82.75	82.65	83.9	86.09	100.33	102.5	105	107.27
ख. प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र																					
9	हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	0.6	0.6	0.61	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
10	हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	62.75	62.84	62.86	67.81	67.82	67.82	70.68	70.69	70.69	70.69	70.7	70.7	70.7	48.82	48.82	48.84	48.84	48.84	48.85	48.86
11	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड		7.88	26.94	47.6	70.6	70.6	113.7	113.7	113.7	122.04	122.04	122.04	122.04	122.04	122.04	122.04	122.04	122.04	122.04	122.04
12	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	12.71	14.4	15.53	16.59	18.05	18.58	19.86	19.86	20.19	20.19	20.19	21.4	21.46	21.46	22.46	24.06	28.86	29.79	30.92	34.07
13	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	7.74	7.74	7.81	7.81	7.81	7.81	7.82	8.82	8.83	9.83	9.84	9.85	9.86	9.86	9.88	9.89	9.9	9.9	9.9	9.9
14	फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0.05	0.05
15	हरियाणा वित्तीय निगम	25.28	25.28	25.28	25.28	25.28	25.28	28.28	33.28	99.03	179.9	181.35	181.85	201.86	201.86	202.01	202.01	202.01	202.01	202.01	202.01

सा.क्षे.उ. (सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों) पर वर्ष 2020 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 2

क्र. सं.	कंपनी का नाम	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
16	हरियाणा कंक्रीट लिमिटेड	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
	कुल ख	111.98	121.64	141.93	168.19	192.66	193.19	243.44	249.45	315.54	405.75	407.22	408.94	429.02	407.14	408.31	409.94	414.75	415.68	416.87	420.03
	ग. अन्य																				
17	हरियाणा चिकित्सा सेवाएं निगम लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5
18	हरियाणा परिवहन अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड	2	2	2	2	2	2	4	4	5	6.2	6.4	6.4	6.6	6.6	6.6	6.6	6.65	6.65	6.75	6.75
19	हरियाणा रेल मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.08	10.2
20	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	18	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
21	हरियाणा मास रेपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	14.4
	कुल ग	20	27	27	27	27	27	29	29	30	31.2	31.4	31.4	31.6	31.6	32.11	37.11	37.16	37.16	41.34	61.35
	सकल योग	164.22	209.70	230.74	258.78	270.29	272.77	330.55	342.71	414.78	510.70	515.68	522.09	543.37	521.39	524.32	533.14	552.24	555.34	563.21	588.65
