

KLIP cost likely to exceed ₹1.47 lakh crore: CAG

M. Rajeev
HYDERABAD

The Comptroller and Auditor General of India has said that the project cost of Kaleshwaram project is likely to exceed ₹1.47 lakh crore as against the ₹81,911 crore projected to the Central Water Commission and the capital cost of irrigation works out to ₹6.42 lakh an acre.

The project cost was understated in the Detailed Project Report (DPR) due to preparation of estimates at old price levels and non-inclusion of provision for price escalation. This, coupled with subsequent changes made in the project works, resulted in the cost of works increasing from ₹63,352 crore to ₹1.02 lakh crore. The increase in cost is likely as cost of works relating to land acquisition, rehabilitation and resettlement, interest during construction and others are yet to be entrusted, the CAG said in the

CAG report terms the project ab-initio economically unviable

performance audit report on Kaleshwaram project tabled in the Telangana Legislative Assembly on Thursday.

The benefit cost ratio of the project was inflated by overstating the value of project benefits and understating the annual costs. The agriculture benefits were calculated on the assumption that one TMC of water would irrigate 17,688 acres of the command ayacut. Data of other projects in the State showed that one TMC ft of water could serve an average of only 10,000 acres.

"Thus, there is a significant risk that the 169 TMC ft of water allocated for irrigation under the project will not be sufficient for kharif season and there is a high risk that no water will

be left for irrigation in rabi season," the CAG said. Even with the understated project cost of ₹81,911 crore, the benefit cost ratio worked out to 0.75 (as against 1.51 projected) indicating that the project was ab-initio economically unviable. "This means every rupee spent on the project would yield only 52 paise," the CAG said.

The CAG outlined the reasons that led to re-design of Pranahita Chevella Sujala Sravanthi (PCSS) into Dr. B.R. Ambedkar PCSS and the Kaleshwaram projects. During re-engineering, the Kaleshwaram and PCSS projects together were estimated to cost ₹85,651 crore as against the project cost of earlier PCSS project. While the combined project cost increased by 122% due to re-engineering, the targeted command area increased by only 52.22%.

CONTINUED ON

» PAGE 6

HINDU

16/2/24

Annexure - 1

①

From Page One

KLIP cost may exceed ₹1.47 lakh crore: CAG

Even after initial re-engineering, further additions and changes were made in the scope of the project works taking the present likely cost of the project to ₹1.47 lakh crore while there was no further increase in the envisaged benefits.

The combined project cost of the two projects (PCSS and Kaleshwaram) stood at ₹1.51 lakh crore. This might increase further as the DPR of Pranahita project was not prepared (by March 2022) and its cost was yet to be worked out. Moreover, due to re-engineering of PCSS project and changes made in the works, certain portions of works already executed had become redundant resulting in a loss of ₹767.78 crore. The Irrigation department entrusted the preparation of DPR to Water and Power Consultants (WAPCOS) despite several deficiencies in the earlier works of the WAPCOS in the preparation of DPR for Pranahita Chevella project which led to its re-engineering.

"As was done in the case of PCSS, the department showed undue haste in award of works of Kaleshwaram project also. The department awarded 17 works costing ₹25,049.99 crore relating to the project even before approval of the DPR by CWC in 2018," the CAG said. After the approval of DPR, changes were made in the project works.

KLIP will need ₹10,374 cr. towards energy charges every year: CAG report


Kaleshwaram project will require 8,459 MW, 46.82% of installed capacity after completion; more than the daily average availed in the entire State in 2021-22: Comptroller and Auditor General

M. Rajeev
HYDERABAD

The much-publicised Kaleshwaram project will require 8,459.1 MW power working out to 46.82% of the total installed capacity available in Telangana.

The project will require 14,344 million units of energy every year after completion. The peak energy demand when all the pumps are likely to be operated simultaneously during the pumping season works out to 203.02 MU per day. "This is more than the daily average availed in the entire State in 2021-22," the Comptroller and Auditor General (CAG) of India said.

The annual recurring cost on electricity charges was understated by adopting a lower rate of ₹3 a unit whereas the prevailing tariff for lift irrigation schemes was ₹6.4 a unit. As the State was presently purchasing/importing nearly 60% of energy from external sources, providing power to various lift irrigation projects, including



The cover of the CAG report.

Kaleshwaram, would be a challenge to the State, CAG said in the performance audit report on the project tabled in the Assembly on Thursday.

The CAG said the project would require ₹10,374 crore towards energy charges every year. In addition, there would also be annual operation and maintenance cost of ₹272.7 crore. Thus, the commitment on the annual operational costs of the project would be ₹10,647 crore per year working out to ₹46,364 an acre.

In addition, there would be depreciation on project

works which worked out to ₹2,760 crore a year. The report said the project cost was estimated at ₹81,911 crore but the government had not accorded administrative approval for the project as a whole. Instead, the government had been issuing separate approvals for individual works on piece meal manner.

"As of March 2022, as many as 73 administrative approvals aggregating to ₹1.1 lakh crore were given. There were no orders from the government about the funding pattern for the project," the report said.

The CAG said the DPR however stated that there were no proposals for water levy at present and hence, the revenue from water charges could be taken as nil.

The revenues from supply of industrial drinking water and fisheries would also be negligible and thus the entire operational cost should be borne by the government/Kaleshwaram Lift Irrigation Corporation Limited.

The KIPCL did not had any sources of revenue and

the burden of repayment of the loan and interest was likely to fall on the State budget. The KIPCL had been paying interest of loans and principal from the funds released by the government in the form of loans/equity.

Loans amounting to ₹1,690 crore were diverted/transferred to government leading to additional interest burden of ₹587.65 crore.

The CAG referred to Mallannasagar as the largest reservoir constructed with a huge capacity of 50 tmcft. A preliminary study by the NGRI revealed that there was a deep seated vertical fault in the proposed location of the reservoir. "However, the department went ahead and constructed it with a total expenditure of ₹6,126.8 crore without conducting detailed seismic studies.

On the contract management, the CAG said the department provided a total amount of ₹17,653 crore towards the cost of pumps, motors and auxiliary equipment in the estimates of these works without assessing the market rates.

Final cost of KLIS will likely touch ₹1,47,427.41 crore: CA

CAG: BRS broke rules for KLIS

BALU PULIPAKA | DC
HYDERABAD, FEB. 15

WHAT CAG SAYS

AS PER 2022 DATA, said cost of KLIS will touch ₹1,47,427.41 cr, against ₹81,911.01 cr projected to the Central Water Commission.



● **NO PLAN** for sourcing of funds for a project of this scale.




THIS IS an indication of improper planning and ad-hocism.

— CAG

● **THE PROJECT** will return 52 paise for every rupee spent on it.

● **SEVERAL COMPONENTS** of the project were approved and handed to contractors even before detailed project reports were finalised.

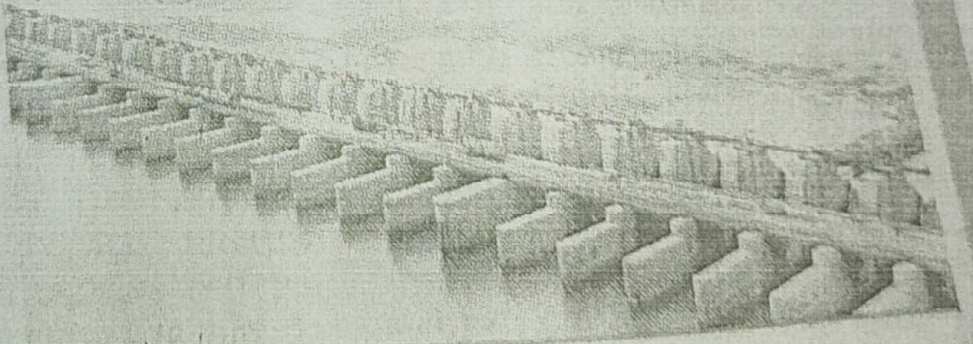

The Kaleshwaram Lift Irrigation Scheme (KLIS) of the BRS government was a rushed affair, with the then government and its irrigation department cutting corners, inflating costs, skipping comprehensive plans for sourcing funds, and flouting other norms, the Comptroller and Auditor General of India (CAG) said.

Several components of the project were approved and handed to contractors even before detailed project reports were finalised, CAG audit found, as tabled by Congress government on Thursday in the state Legislative Assembly.

The findings on various aspects of Kaleshwaram project are expected to further fuel charges that the then BRS government either neglected or chose to ignore many deficiencies in the project design

and its execution. Nearly each of 218 pages of report an indictment of BRS government.

The CAG report, which took into consideration the project execution till 2022, said final cost of

the entire Kaleshwaram project will likely touch ₹1,47,427.41 crore, against the original cost of ₹81,911.01 crore

■ Page 2: CAG audit reports KLIS financial disaster

Annexure - 1

(2)

Design defects caused damage to KLIS: CAG

CAG points to studies carried out by irrigation department


BALU PULIPAKA | DC
HYDERABAD, FEB. 15

The CAG said that design faults resulted in the damages — that began in November 2019 — to the Medigadda barrage, as well as the Annaram and Sundilla barrages of the Kaleshwaram lift irrigation scheme (KLIS). The CAG said that these designs were prepared by the Central Designs Organization of the irrigation department.

The CAG said after the gates of barrages were closed after the 2019 floods, it was found that the reinforced cement concrete wearing coat and cement concrete blocks on the downstream side were washed away, resulting in a loss of ₹180.39 crore, the amount spent on these works. *Deccan Chronicle* had on October 24, 2023 — three days after the sinking of a portion of the Medigadda barrage came to light — reported that possible design flaws caused the barrage to sink. The CAG said that studies by the irrigation department revealed that the damage was caused due to high discharge velocities of the water and inadequate provision for energy dissipation works.

The CAG report also said that the department approached the contractor for taking up repairs estimated to cost ₹476.03 crore, but was told that the work was executed strictly, as per designs and drawings approved by the department and under the supervision of the department engineers. The report said that although the department claimed that the contractor was liable to take up the repairs under the 'defect liability period' clause, the government's contention was "not correct as more than three and half years elapsed," by the time the rectification works were sought to be executed.

FUNDS REQUIRED TO PAY KLIS LOANS

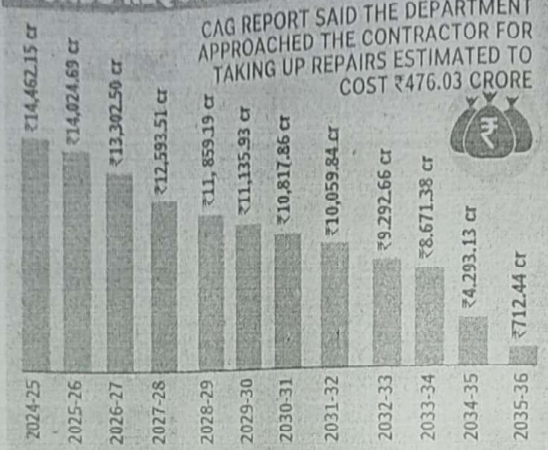

CAG POINTS TO UNREALISTIC TIMELINES GIVEN FOR DPRs

- 4 MONTHS:** Kaleshwaram project, Medigadda barrage, lift/canal system; from Medigadda to Mid-Manair.
- 2 MONTHS:** Vetting of DPT for lift system from Mid-Manair to Tadkapally/Pamulaparthy/ Nizamsagar.
- 15 DAYS:** LIDAR survey of 1,900 sq km covering Godavari river, water conducting systems from Kondapochamma reservoir to Bhumpally, linking Kaleshwaram with Kakatiya Canal, preparation of DPR for diverting 160 tmc ft water by building Medigadda barrage.
- 2 MONTHS:** Preparation of DPRs for Annaram, Sundilla barrages, increase reservoirs storage capacity.
- 2 MONTHS:** DPT for vetting alignment from Mallannasagar to Singur reservoir.



CAG INDICATES KLIS FINANCIAL DISASTER

FROM PAGE 1

The CAG made it clear that the project was a financial disaster, with a return of just 52 paise for every rupee spent on it. This "clearly indicates that the project was ab initio (from the beginning), economically unviable."

It further said that there was no comprehensive plan for the sources of funds for "a project of this scale, which will further have a long-term impact on the finances of the state." This, the CAG said, "is an indication of improper planning and ad-hocism." The BRS government, despite the high project cost, did not accord administrative approval for the entire project but instead, kept issuing separate administrative approvals.

Full reports in *deccanchronicle.com*

Mallannasagar ticking time bomb —

DC CORRESPONDENT
HYDERABAD, FEB. 15

PRONE TO QUAKE

The Mallannasagar reservoir, built under the Kaleshwaram scheme, is located in an area that could be prone to serious seismic activity, as per the CAG report tabled in the Assembly on Thursday. There was no plan to deal with an emergency, if one occurred.

The 218-page report said the reservoir was built without carrying out detailed seismic surveys of the area, despite an advisory from the city-based National

Geophysical Research Institute (NGRI).

The CAG said the irrigation department was specifically told by the Central Designs Organisation — an independent wing of the state irrigation department — which approved the initial preliminary drawings of the reservoir, that a detailed site-specific seismic study was required before final designs could be approved.

After the NGRI agreed to do the study, the depart-

ment chose not to wait for the report and awarded the contract in December 2017, stipulating that the construction must be completed by December 2020.

The NGRI submitted its preliminary report in March 2018, saying that there were reasons for concern about the safety of the reservoir and recommended a more detailed survey.

There were at least three features in the location that indicated geological faults, and their relationship with the surface needed to be studied, it said.

It's unviable, will bleed T': CAG damns Kaleshwaram

Report: Project
Benefit-Cost
Ratio Inflated


Koride.Mahesh
@timesgroup.com

Hyderabad: In a damning report, the Comptroller and Auditor General (CAG) has said Kaleshwaram—touted as the

► **FULL COVERAGE: P2 & 3**

world's biggest multi-stage lift irrigation project on Godavari river in Telangana's Bhupalpally to irrigate about one crore acres—is not only economically unviable but also

MEGA PROJECT IN CHOPPY WATERS



► **Multi-purpose and multi-stage** lift irrigation project planned to lift water from the Godavari river at Medigadda

► Project execution divided into **seven** links and **56** packages

► Designed to provide **irrigation, drinking water to 13 districts** of Telangana, including Hyderabad and its adjoining areas

► KLIP comprises **three barrages - Medigadda, Annaram and Sundilla**, 14 reservoirs, 31 lifts and 1,832 km canals, tunnels and pipelines

cannot generate revenues and will leave a huge energy bill for govt.

Claiming that the benefit-cost ratio (BCR) of the project was grossly inflated, CAG in

its report said the actual command area created so far was just 40,888 acres (till March 2022). The 260-page report, which was tabled in the state assembly on Thursday also

pointed out violations—right from seeking project approvals, escalation in cost, ayacut area, execution of works and benefits of the project.

The much-hyped project was inaugurated by the then governor ESL Narasimhan and former CM K Chandrasekhar Rao on June 21, 2019. While the project's daily drawal capacity was enhanced from 2 tmcft to 3 tmcft, the BRS govt did not take revised approvals of the Central Water Commission and also the environment ministry's approvals even as the project cost increased to Rs 1.02 lakh crore from Rs 63,352 crore.

► **Continued on P2**

Every Rupee Spent On K LIS Would Yield Only 52 Paise ■ Claim Of Contractor Rectifying Medigadda Damage Incorrect

Kaleshwaram A Fund & Energy Sinkhole: CAG Report

The Times of India Feb 16, 2024

Koride.Mahesh
@timesgroup.com

Hyderabad: While claiming the Kaleshwaram Lift Irrigation project was unviable, the Comptroller and Auditor General's (CAG) report said its benefit-cost ratio (BCR) was grossly inflated.

The report disproved of the project benefits as claimed by the previous BRS govt and said the cost was likely to exceed ₹1.47 lakh crore.

"For every rupee spent on the project, it will yield only 52 paise, which indicates that the project — from the outset — is not viable at all. Taking into account the escalated costs, the ratio comes down to 10.52. Even when the project cost was put at ₹81,911 crore, the ratio of the project is 1.0.75 in contrast to the state govt's claim of 11.5," CAG said.


Experts said if a project's BCR is less than 1.0, the project's costs far outweigh the benefits and it should not be considered.

CAG also expressed concern over repayment of loans taken through the Kaleshwaram Lift Irrigation Corporation as it did not have any revenue source. There was also no proposal to collect water charges from beneficiaries.

CAG said power demand to lift water from 22 pump-houses would be high. The lifts under the project require 6,456 MW of power, which works out to 49% of the installed capacity available in the state. The project requires 14,344 million units of energy every year after completion.

CAG said assuming the project becomes fully operational from 2024-25 and that lifting of water will take place as per plan, Kaleshwaram project will require ₹10,775 crore annually towards energy consumption charges (including fixed charges), which translates into ₹1,24,456 crore in the next 12 years.

In addition to energy charges, annual operation and maintenance costs work out to ₹273 crore per annum, and there will be depreciation of ₹2,761 crore per annum, CAG said. "Repayment of loans, interests, O&M costs and depreciation costs together will constitute a huge burden on state's finances," it said.

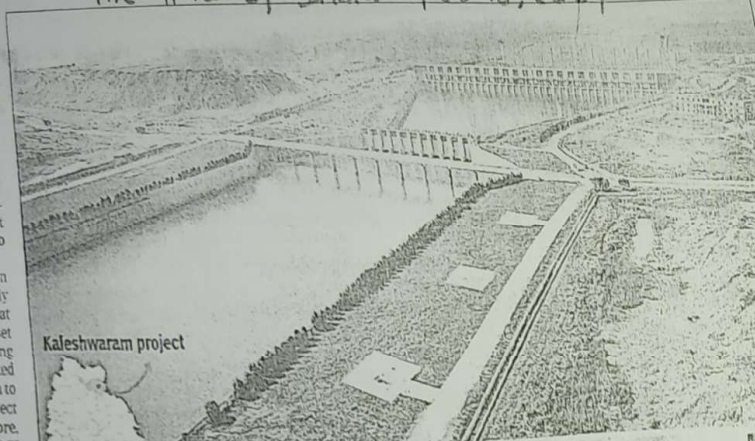

Kaleshwaram project

KALESHWARAM IN TROUBLED WATERS

KALESHWARAM

• Works entrusted so far (March 2022), against targeted 18.2 lakh acres: 14.8 lakh acres

• Cost of seventeen works awarded even before the approval of DPR: ₹25,000cr

• Market loans raised by KIPCL with guarantees provided by state govt: ₹87,449cr


• Pumping capacity increased from 2 tmcft to 3 tmcft for additional cost: ₹28,151cr

• Due to re-engineering, certain works had become redundant, resulting in loss: ₹750cr

• Possibility of undue benefit to contractors for supply and commissioning: ₹2,600cr

• Post tender inclusion of price adjustment clause resulted in avoidable payment: ₹1,000cr

• Total project works 56
• Completed works 12
• Ongoing works 40
• Not yet commenced 4

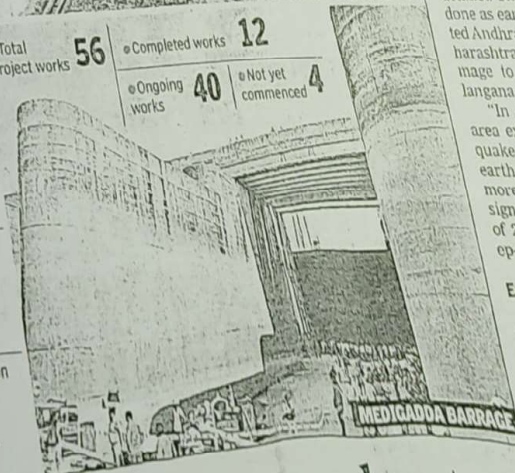

Mallanna Sagar in seismic zone, T ignored NGRI reports in 2020

Koride.Mahesh
@timesgroup.com

Hyderabad: In a significant observation, CAG said Mallanna Sagar reservoir was located in a seismic zone and there was a deep-seated vertical fault in the reservoir site. The National Geophysical Research Institute, which had submitted a preliminary report on Mallanna Sagar to the irrigation department in Dec 2020, said detailed studies need to be done as earthquakes in united Andhra Pradesh and Maharashtra's Latur caused damage to structures in Telangana region.

"In June 1983, Medchal area experienced an earthquake of 4.9 magnitude. This earthquake had a depth of more than 15 km and was felt significantly up to a distance of 200 km because of its deep-seated origin," CAG said.

Earthquake epicentre

It added that the epicentre distance of this earthquake is about 20 km from the Mallanna Sagar reservoir site. CAG said the irrigation department approached NGRI in Aug 2016 to get a site-specific seismic study before approval of the drawings for the reservoir. But the irrigation department awarded the work to the contractor in Dec 2017 and asked contractor to complete the work by Dec 2020.

"Keeping in view of the historical seismicity status of the region, an earthquake of magnitude 5 or more is likely to cause damage to non-engineered structures. Hence, any installation planned should be in conformity to withstand the levels of ground shaking," CAG said.

Despite the recommendations of NGRI, the govt did not conduct any detailed survey of the location and went ahead with construction of Mallanna Sagar, CAG added.

CAG picks holes in govt 'urgency'

Hyderabad: Taking a serious view of BRS govt according administrative approvals to Kaleshwaram project as a whole instead of separate approvals for each work, CAG picked holes in irrigation department's 'urgency' to carry out project works.

Project cost rose to ₹1.02 lakh cr from ₹63,252 crore, likely to exceed ₹1.47 lakh crore. It said 73 approvals worth ₹1.1 lakh crore were granted without orders from govt on funding pattern. It said govt incurred loss of ₹600 crore owing to re-engineering of Pranahita and executing some works under old scheme. The

Medigadda mess due to defective design: Auditor

Koride.Mahesh
@timesgroup.com

Hyderabad: Indicating that the piers of Medigadda sank due to defective designing and improper surveys while constructing the barrages of Medigadda, Annaram and Sundilla, CAG said the BRS govt's claim that the contractor had agreed to rectify the damages was incorrect.

CAG said the irrigation department admitted that the damages at Medigadda were

first noticed in Nov 2010 (six months after inauguration of Kaleshwaram in June). I&T, the contractor, also wrote a letter about the barrage damages to the irrigation department in May 2020, it said.

"In Nov 2010, these barrages received floodwater and water was released downstream. After closing the gates, it was found that the RCC wearing coat, part of concrete curtain walls, CC blocks got washed away resulting in a loss of ₹100 crore," the report said. Now, the govt may have to bear the expenditure for repairs.

The audit agency said the irrigation wing's studies had revealed that the reason for sinking of piers was due to high discharge velocities of the water released and inadequate provision of the energy dissipation works. I&T said the works were done as per the designs and drawings provided by irrigation wing. Hence, the contractors did not take any responsibility.

'It's unviable CAG dam

Report: Project Benefit-Cost Ratio Inflated

Koride.Mahesh
@timesgroup.com

Hyderabad: In a damning report, the Comptroller and Auditor General (CAG) has said Kaleshwaram — touted as

► FULL COVERAGE: 72% world's biggest multi-lift irrigation project on Narmada river in Telangana — is not economically unviable.

INDIAN EXPRESS Feb 16, 2024

KLIS economically unviable: CAG

Annexure-1

(4)

VV BALAKRISHNA @ Hyderabad

THE re-engineered Kaleshwaram Lift Irrigation Scheme (KLIS) is economically unviable, the Comptroller and Auditor General (CAG) said in its 'Performance Audit on Kaleshwaram' report that was tabled in the Telangana Legislative Assembly on Thursday.

Pointing out several lapses, the CAG said in its report: "The audit analysis revealed that the re-engineered Kaleshwaram project was economically unviable, ab initio. In the DPR, the benefit-cost ratio was inflated by under-projecting the annual costs and overstating the value of annual benefits expected from the project."

It said that the benefit-cost ratio of the project was inflated; even with the understated project cost of ₹81,911.01 crore, the ratio works out to 0.75. Considering the latest likely project cost of ₹1,47,427.41 crore, the ratio becomes 0.52.


This means that every rupee spent on the project would yield only 52 paise. It clearly indicates that the project was, ab initio, economically unviable. The CAG said that debt servicing would be a big burden on the government.

"The Kaleshwaram Irrigation Project Corporation Limited (KIPCL)/ government requires a total amount of ₹1,41,544.59 crore (ranging from ₹712.44 crore to ₹14,462.15 crore every year) in the next 14 years for debt servicing. There are no orders from the government regarding the funding pattern for the project, duly indicating the proposed funding from the state Budget and funding proposed through other sources including market loans. The absence of a comprehensive plan duly spelling out the sources of funds for a project of this scale, which will have a long-term impact on the finances of the state, is an indication of improper planning and ad-hocism," the CAG pointed out.

CONTINUED ON P4

IMPROPER PLANNING, AD-HOCISM: MAJOR FINDINGS

- The cost of KLIS is now likely to exceed ₹1,47,427.41 crore, as against the ₹81,911.01 crore projected to the CWC
- The state government has not accorded administrative approval to the project as a whole and instead, it has issued separate approvals — as many as 73 administrative approvals aggregating to ₹1,10,248.48 crore; there are no orders from the government about the funding pattern for the project
- Of the total expenditure of ₹86,788.06 crore incurred on the project (March 2022), ₹55,807.86 crore (i.e., 64.3%) was met from the off-budget borrowings raised by KIPCL
- The benefit-cost ratio of the project was inflated. Even with the understated project cost of ₹81,911.01 crore, it is 0.75. Considering the latest likely project cost (₹1,47,427.41 crore), the ratio becomes 0.52, which means that for every ₹1 spent on it would yield only 52.
- The peak energy demand, when all the pumps are operated, is more than the average daily energy available in the entire state (2021-22). Providing power to the lift irrigation scheme will pose a challenge to the state
- The absence of a comprehensive plan duly spelling out the sources of funds for a project of this magnitude, which will have a long-term impact on the finances of the state, is an indication of improper planning and ad-hocism



CHECKS NEEDED TO AVOID ANOTHER KALESHWARAM

INDIAN EXPRESS Feb 16, 2024

ONE of the costliest lift irrigation projects in the world, Kaleshwaram was touted as the previous Bharat Rashtra Samithi government's crowning achievement in Telangana. Any debate on its viability or design was dismissed with disdain by the then chief minister K Chandrasekhara Reddy. Things came to a head when three piers of the Medigadda barrage, the water source of the mammoth project, sank by a few metres. The auditor general's report tabled in the state assembly on Thursday finally laid bare the gigantic mess that Kaleshwaram is.

The cost of the Kaleshwaram project is likely to exceed ₹1,47,427 crore, up from the initial projection of ₹81,911 crore. The auditor general found the project—which consists of three barrages, 17 reservoirs, several pump houses and canals—unviable for many reasons, prominent being the cost-benefit ratio of just 0.52 paise. The energy cost to operate the project is estimated to be at least around ₹7,000 crore a year and debt-servicing for the next 14 years is about the same as the project cost. If the project's objective, which is to irrigate over 18 lakh acres, were met, one could argue that the expenditure was justified. Regrettably, it does not seem to be the case. If one goes by the audit report, there are many mistakes in the project's execution. The state government did not have a proper funding pattern and relied heavily on off-budget borrowings. Now the situation is such that water cannot be stored beyond a low level at it, the project is all but a white elephant.

If a party in power could push through a project like Kaleshwaram in haste, is there an institutional mechanism to stop it? The intentions could be good; but if the outcome becomes a liability for generations to come, we must debate and put checks and balances in place. Telangana has the unenviable task of salvaging the project. The government has decided to form an expert panel comprising members from the National Dam Safety Authority to conduct a comprehensive study in order to decide the future course of action. It should also ask the Centre and the financial institutions concerned to restructure the loans. And the man whose brainchild it is, KCR, has some explaining to do.

CHECKS NEEDED TO AVOID ANOTHER KALESHWARAM

INDIAN EXPRESS Feb 16, 2021

Annexure -1

(4)

ONE of the costliest lift irrigation projects in the world, Kaleshwaram was touted as the previous Bharat Rashtra Samithi government's crowning achievement in Telangana. Any debate on its viability or design was dismissed with disdain by the then chief minister K Chandrasekhar Rao. Things came to a head when three piers of the Medigadda barrage, the water source of the mammoth project, sank by a few metres. The auditor general's report tabled in the state assembly on Thursday finally laid bare the gigantic mess that Kaleshwaram is.

The cost of the Kaleshwaram project is likely to exceed ₹1,47,427 crore, up from the initial projection of ₹81,911 crore. The auditor general found the project—which consists of three barrages, 17 reservoirs, several pump houses and canals—unviable for many reasons, prominent being the cost-benefit ratio of just 0.52 paise. The energy cost to operate the project is estimated to be at least around ₹7,000 crore a year and debt-servicing for the next 14 years is about the same as the project cost. If the project's objective, which is to irrigate over 18 lakh acres, were met, one could argue that the expenditure was justified. Regrettably, it does not seem to be the case. If one goes by the audit report, there are many mistakes in the project's execution. The state government did not have a proper funding pattern and relied heavily on off-budget borrowings. Now the situation is such that water cannot be stored beyond a low level to avoid further structural damage. Any which way you look at it, the project is all but a white elephant.

If a party in power could push through a project like Kaleshwaram in haste, is there an institutional mechanism to stop it? The intentions could be good; but if the outcome becomes a liability for generations to come, we must debate and put checks and balances in place. Telangana has the unenviable task of salvaging the project. The government has decided to form an expert panel comprising members from the National Dam Safety Authority to conduct a comprehensive study in order to decide the future course of action. It should also ask the Centre and the financial institutions concerned to restructure the loans. And the man whose brainchild it is, KCR, has some explaining to do.

Telangana's largest reservoir, Mallanna Sagar not safe

- Possibility of damage to the reservoir not ruled out
- Seven reservoirs under Kaleshwaram were submerging and requiring the families displaced by the project to be R and R
- More than six years passed since the decision to re-engineer the project was made
- Project work has already cost Rs 878 cr, but it has not produced any results

HANS NEWS SERVICE
HYDERABAD

THE largest reservoir of Komaravelli Mallanna Sagar with 50 TMC capacity in Telangana was not safe. The CAG report revealed that the reservoir, which was

constructed as part of the Kaleshwaram Lift Irrigation Scheme, was a deep seated vertical fault in the proposed location. The report mentioned the NGRI (National Geophysical Research Institute (NGRI) seismic studies at the reservoir.

The report said that the possibility of damage to the reservoir was not ruled out due to the location of the construction in the seismic zone. However, the previous government went ahead and constructed the reservoir with a total expenditure

of Rs 6,126.809 crore after conducting in-depth seismic studies.

The report also disclosed that seven reservoirs under Kaleshwaram were causing submergence and involved Rehabilitation and Resettlement (R and R) of the



project-displaced families. However, R and R activities in respect of only three reservoirs were completed, and in the remaining four reservoirs, the department had yet to identify the project-displaced families fully, and R and R had yet to be taken up.

Referring to the status of the Pranahita project, the report said that there has been no progress in the four works retained under the project after re-engineering in the last four years.

More than six years have passed since the decision to re-engineer the project was made in order to determine the location of the barrage,

the new command area that was to be targeted, the extent of the work, and to prepare and submit the DPR to the Central Water Commission (CWC). The then government did not obtain all the statutory clearances, including the CWC and the concurrence of Maharashtra, for the project.

No command area has been developed under the project, and it may take many more years for the construction of the project and to derive any irrigation benefits from it. The expenditure of Rs 878 crore already incurred on the project work remained unproductive.

HANS INDIA 16/2/24

Kaleshwaram unviable: CAG

Says money drowned literally in Krishna


PATAN AFZAL BABU
HYDERABAD

THE Comptroller and Auditor General's (CAG) report exposes undue benefits that the contractors got in the execution of the works of the Kaleshwaram project. The report said the Irrigation department had shown undue haste in the award of works and the Benefit-Cost Ratio (BCR) of the project was inflated.

The report pointed out that the Kaleshwaram Lift Irrigation Scheme (KLIS), claimed to be the world's biggest LI project by the previous BRS government, was 'economically unviable'. It said that every rupee spent on the project would yield only 52 paise. The CAG also said the previous government did not take any administrative approval for the project as a whole.

The CAG also found fault with the BRS government for not submitting the revised DPR (Detailed Project Report) to the Centre on the enhancement of withdrawal of water from 2 tmc ft to 3 tmc ft from the project every day.

The report which was tabled in the Assembly on Thursday said that considering the latest likely project cost (Rs 1,47,427.41

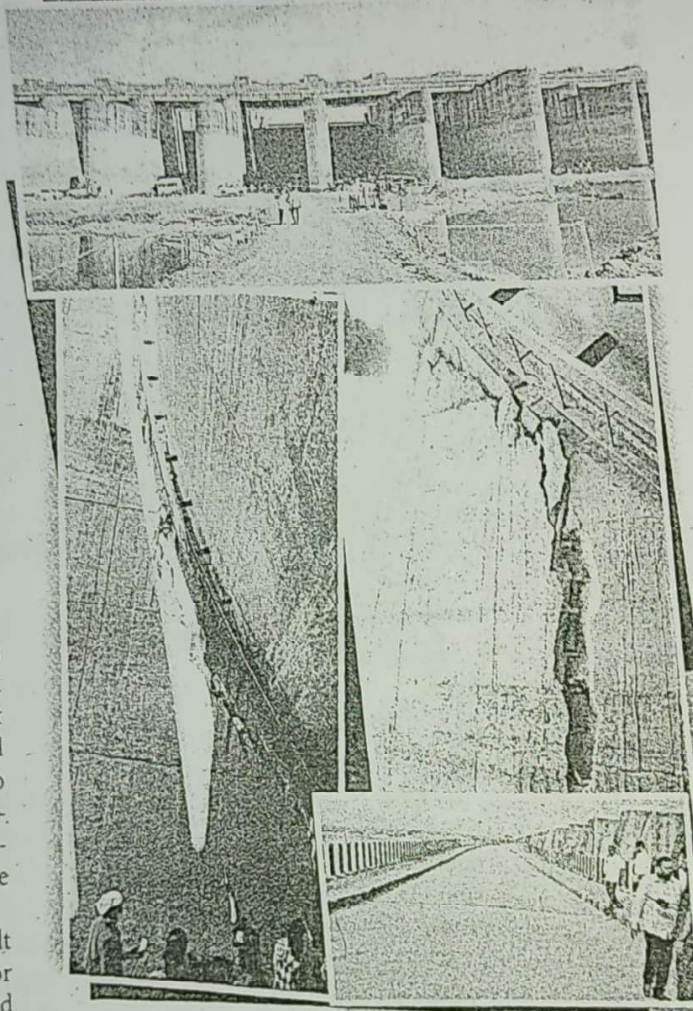

crore), the Benefit Cost Ratio (BCR) worked out to only Rs 52 paise. The BCR is likely to go much lower considering the possibility of further increase in the cost of works and interest component while the actual benefits/revenues from agriculture and industrial/drinking water

supply would be much lower.

The report further said originally it was estimated that the project would cost Rs 81,911 crore. Instead of taking administrative approval for the entire project, the government had issued separate approvals for individual works in a piecemeal

manner. As of March 2022, as many as 73 administrative approvals aggregating to Rs 1.10,248 crore have been given. There were also no orders from the government about the funding pattern for the project. The Kaleshwaram Irrigation Project Corporation Limited (KIPCL) raised market loans of Rs 87,449 crore with guarantees provided by the state government. The corporation does not have any sources of revenue and the burden of repayment of the loan and interest was likely to fall on the state government, the report said.

The KIPCL required a total amount of Rs 1,41,544 crore (ranging from Rs 712 crore to Rs 14,462 crore every year) in the next 14 years for debt servicing. This will have a long-term impact on the finances of the state and it was an indication of improper planning and ad hocism, the CAG said.

The CAG also found that the Irrigation department entrusted the work of the preparation of the DPR for the Kaleshwaram project to the Water and Power Consultants Limited (WAPCOS) despite several deficiencies in its earlier DPRs of Pranahita Chevella Sujala Sravanthi (PCSS) project, the CAG added.

Kaleshwaram Lift Irrigation Scheme burdens State with ₹10,000 crore annually


Annexure - 1
(5)

- CAG report reveals 8,459 MW power needed for project yearly
- Project demands 14,344 million units of energy post-completion annually
- Peak energy demand surpasses entire State's average in 2021-22
- Annual electricity charges understated at

Rs 3 instead of Rs 6.4

- State's challenge due to 60% energy purchase for lift projects

- CAG estimates Rs 10,374 crore yearly energy charges for Kaleshwaram



HANS NEWS SERVICE
HYDERABAD

THE much-hyped Kaleshwaram Lift Irrigation Scheme was burdensome for the State government due to its maintenance. The project required more than Rs 10,000 crore for energy requirements and its maintenance every year. The CAG, in its report, said that 8,459 MW of power, which means 46.82 per cent of the total installment of the power generation capacity available in the State, was required to run the project every year.

The project would require a total of 14,344 million units of energy every year after completion. The peak energy demand would be 203.02 MU per day. "This is more than the daily average energy availed in the entire State in 2021-22," the Comptroller and Auditor General of India said.

The annual recurring cost of electricity charges was understated by adopting a lower rate of Rs 3 per unit, whereas the prevailing tariff for lift irrigation schemes was Rs 6.4 per unit. As the State was presently purchasing or importing near-

ly 60 per cent of its energy from external sources, providing power to various lift irrigation projects, including Kaleshwaram, would be a big challenge for the State, the CAG said in the performance audit report of the Kaleshwaram project tabled in the Telangana Legislative Assembly on Thursday.

The CAG said the project would require Rs 10,374 crore towards energy charges every year. In addition, there would also be an annual operation and maintenance cost of Rs 272.7 crore. Thus, the commitment to the annual operational costs of the project would be Rs 10,647 crore per year, working out to Rs 46,364 per acre. The report also said that in the DPR, it was stated that there were no proposals for a water levy at present. Hence, the revenue from water charges would be nil. The revenues from the supply of industrial and drinking water needs and fisheries would also be negligible. Thus, almost the entire operational cost of the project has to be borne by the State government, or Kaleshwaram Irrigation Project Corporation Limited (KIPCL).

HANS INDIA 16/2/24

ఆకృతి లోపాలు..

అదనపు చెల్లింపులు

కాశీశ్వరంపై కాగ్ విశ్లేషణ

కనాడు, హైదరాబాద్: కాశీశ్వరం ఎత్తిపోతల పథకంలో లోపాలు ఏమి వ్యాపారంలో గుర్తించబడతాయి అనుచూ నిర్ణయాలను కాగ్ ఎత్తిపోతల పథకం మొదటి రిపోర్టులో మేడిగల్గి అన్నారు. సుందీర్ బ్యాంకేజీని నిర్మాణం 2016 అక్టోబరు నుంచి 2021 డిసెంబరు మధ్య జరిగింది. 2019 నవంబరులో చర్యలను కాగ్ గేట్లు ఎత్తి పోతల పథకం అన్ని బ్యాంకేజీలో అమలై విడుదలై కేట్, సీస్ కట్టిన వార్త బ్యాంకేజీ దిగువన ఉన్న సీస్ బ్యాంకు కొట్టుకుపోవడం వల్ల రూ.180.39 కోట్ల నష్టం వాటిల్లింది. కాంగ్రెస్, ఆప్, సీస్ బ్యాంకు డిజైన్లో రోలు వల్ల చిటి ప్రవాహ వేగంతో తక్కువైన చెత్తలెత్తాయి. డిజైన్ ప్రకారమే ముందు పోతలను దీనితో కాను కారణం కారణంగా పనులు చేయడానికి గుర్తించారు నిరాశించారు. కర్నూలు ఈ ప్రయత్నం రూ.476.03 కోట్ల నష్టం చిన అంచనాలతో ప్రతిపాదన పంపారు" అని కాగ్ తెలిపింది.


ఎన్ఎస్ఆర్లో ధరలు లేక అదనపు చెల్లింపులు

నీటిపారుదల శాఖ విధానం చేసే స్టాండ్ డ్రాఫ్టులు ఆపి రివ్యూ(మోషన్)లో ముప్పు, మోడల్స్ వాటి అనుబంధ పరికరాల ధరలు లేవు. చీకాచిటెర్ నుంచి పంపులు, పాల్కలకు నీటిపారుదల శాఖ 2009లో ధరలు కేటకుంది. వీడివీడిగా కాకుండా గుండు త్తగా రరలివారు. 2016లో కాశీశ్వరం ఎత్తిపోతల పునరాకృతిలో వాగంగా సమయ చేపట్టివచ్చు అంచనాను సవరించారు. వాల్సు ప్యాకేజీ అందడాల్లో పేర్కొన్న ధరలకు, చీకాచిటెర్ పేర్కొన్న ధరలకు ఎక్కువ వ్యత్యాసం ఉంది. చీకాచిటెర్ పరిధిలో లేని పరికరాలు, ఉపకరణాల్లో చీకాచిటెర్ అధికం అన్ని మినహాయింబినా. పక్కామనాన ఉన్నాయి కాంక్రీట్ అధికం అనిపి పరికరాలలో కాకుండా అన్ని పరికరాలలోకి కనుపించారు నీటిపారుదల శాఖ పేర్కొంది. కాంత మేము కనుపించు లేదు. చివరకు ఈ ధరలను కూడా మోషన్లో చేర్చాలి.

● టెండర్ లుకొనైన తర్వాత ధరల పెరుగుదల వర్తమానికి నిబంధన పెట్టారు సరికాదు. దీన్ని ఆధారం పెట్టుకొని గుర్తించబడతాయి అదనంగా చెల్లించారు. స్టీలు, సిమెంట్, పెట్రోల్, ఇయర్ లాట్రి బెడ్స్, లేవర్, హెల్మెట్లకు పెరిగిన ధరలు చెల్లించాల్సి వస్తుందని ఉంది. ఇలా చెల్లించేటప్పుడు వ్యాక్ డిజైన్లో చీకాచిటెర్ లోపాలు ఉన్నాయి.

మునిగిన ఫీడర్ చానల్

మల్లన్నసాగర్ రిజర్వాయర్ నుంచి నాలుగు వ్యాకేజీలుగా విడుదలై 2017 అక్టోబరు-డిసెంబరు మధ్య గుర్తించబడతాయి అప్పగించారు. ఒప్పందం ప్రకారం 2020 అక్టోబరు-డిసెంబరు మధ్య ఫూల్ కేయాలి మధ్యమానం నుంచి మల్లన్నసాగర్, మల్లన్నసాగర్ నుంచి దిగువన ఉన్న వ్యాకేజీ 12వ, అల్పడి నుంచి 13, 14 వ్యాకేజీలకు నీటిని తరలింపాలి ఉంది. అయితే మల్లన్నసాగర్ ఫూల్కాముందే 2018 డిసెంబరులో రూ.44.22 కోట్లతో మల్లన్నసాగర్ రిజర్వాయర్లో ఫీడర్ చానల్ రివైవ్ పని చేపట్టారు. దీనితో అయిదుసార్లు గడువు పొడిగించారు. దీనితో అంచనా వ్యయం రూ.60.22 కోట్లకు పెరిగింది.



గింది 2020 మార్చిలో ఫూల్ కేయాలి, ఫీడర్ చానల్ నుంచి నీటిని విడుదల చేయడానికి రూ.2.83 కోట్లతో పియర్ నిర్మించారు. అయితే 2021 అక్టోబర్ మల్లన్నసాగర్ రూ. నీటిలో నింపడంతో ఫీడర్ చానల్ ఆ నీటిలో మునిగిపోయింది. రూ.63.05 కోట్లు వృథా అయ్యాయి.

● సివిల్ వనరులు అయిదేళ్లు, ఎలక్ట్రిక్ మెకానికల్ వనరులు 15 ఏళ్లు, నిర్వహణ బాధ్యత కాంక్రీట్లో ఉంది. పని పూర్తయ్యాక మొదటి రెండేళ్లు డివైజ్ లయిపోయి ఉంటుంది(డివైజ్) ఉంటుంది. ఈ సమయంలో ఏం జరిగినా కాంక్రీట్లో చేయాలి. ఇది ముగిసిన తర్వాత నిర్వహణకు అనుబంధం ఉంటుంది. నేయాలి. అయితే 10, 11, 12 వ్యాకేజీల్లో డివైజ్ సమయం ఫూల్ కేయంమందే అవుతుందిగా చెల్లించారు. మేడిగల్గి బ్యాంకేజీలో డివైజ్ లింగ్ లోను ఆ పని విలువలో నీ కానీకే పనియం చేయాలి. కాగ్, T & E తరం చెల్లించడం వల్ల అదనపు వాతం పడింది" అని కాగ్ తెలిపింది.

కాశీశ్వరం.. పెనుభారం

- 12 ఏళ్లలో ప్రభుత్వం భరించాల్సింది రూ.2.66 లక్షల
- రుణాల తిరిగి చెల్లింపులకే రూ.1.41 లక్షల కోట్లు అవసరం

కనాడు, హైదరాబాద్: రాష్ట్ర ఆర్థిక రంగానికి కాశీశ్వరం పరిష్కారం ప్రాజెక్టు పెనుభారంగా మారనుందని కాంగ్రెస్ అండ్ అడిటర్ జనరల్(కాగ్) నివేదిక స్పష్టం చేసింది. "2022 మార్చి నాటికి కాశీశ్వరం ప్రాజెక్టు సంస్థకు మొత్తం రూ.96,064 కోట్ల రుణం తీసుకుంటామని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గ్యారంటీ ఇచ్చింది. ఇందులో 2022 మార్చి నాటికి రూ.87,449.15 కోట్లు తీసుకుంది. 2085-96 నాటికి వడ్డీ సహా అక్షరాలా రూ.1,41,544.59 కోట్లు తిరిగి చెల్లించాలి. రుణ ఒప్పందాల ప్రకారం తొలుత పేర్కొన్న వడ్డీ రేట్లను పరిగణనలోకి తీసుకుని రెక్కెస్సే తిరిగి చెల్లించాల్సి సామ్యం ఇంత ఉంటుంది. వడ్డీ రేట్లు మారుతుంటాయి. ఇవి పెరిగితే చెల్లించాల్సిన సామ్యం పెరుగుతుంది.

2024-25 నుంచి కాశీశ్వరం ఫూల్స్టాయిల్ పనిచేయడం ప్రారంభమై అనుకున్న ప్రకారం నీటిని ఎత్తిపోస్తే కరెంటు చార్జీల కింద ప్రభుత్వం ఏటా రూ.10,374.58 కోట్ల వాస్తవంగా ప్రాజెక్టు వార్షిక నిర్వహణ కోసం రూ.1,24,495 కోట్లు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. దీనికి అదనంగా ప్రాజెక్టు వార్షిక నిర్వహణ కోసం రూ.272.70 కోట్లు, తయారుదల బడ్జెట్ కిం రూ.2,761 కోట్లు కావాలి. కాశీశ్వరం ప్రాజెక్టు నివేదిక ప్రకారం, పడకం పూర్తయిన పేర్కొన ఆదాయమేమీ రాదు. రాష్ట్రంలో ప్రజలకు సాగు, తాగునీరు నరవరా చేసిన ధుకు కాటాడిని పొందే నిబంధనలేమీ ఇవ్వలేవరకు లేవు. అందువల్ల రూ.266 లక్షల కోట్ల సహా తిరిగి చెల్లించానికి, నిర్వహణ వ్యయం కలిపి మొత్తం రూ.2.66 లక్షల కోట్ల సహా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే రూ.12 ఏళ్లలో భరించాల్సి ఉంటుంది.

● సాధారణ బడ్జెట్కు వెలుపల ప్రభుత్వరంగ సంస్థలు రుణాలు తీసుకుంటే 14 ఏళ్ల తిరిగి చెల్లించాలనే నిబంధనలున్నాయి. ఈ రెక్కెస్ 2022 నుంచి 2036 మధ్య ఎలా కాశీశ్వరం కాల్గోరేవన తీసుకున్న అసలు రుణం రూ.87,989.89 కోట్లతో పాటు వాస్తవంగా వడ్డీ మరో రూ.84,174.70 కోట్లు కలిపి మొత్తం రూ.1,41,544.59 కోట్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది" అని కాగ్ పేర్కొంది.

2022-23	6,910.73
2023-24	13,406.51
2024-25	14,462.15
2025-26	14,024.69
2026-27	13,302.50
2027-28	12,593.51
2028-29	11,859.19
2029-30	11,135.93
2030-31	10,817.86
2031-32	10,059.84
2032-33	9,294.66
2033-34	8,671.38
2034-35	4,293.13
2035-36	712.44

ప్రయోజనాలు ఎక్కువ చేసి చెప్పారు..

ఖర్చులేమో తక్కువ చూపారు

- రూపాయి వ్యయంపై వచ్చే ఆదాయం 52 పైసలే
- కాళేశ్వరంపై కాగ్ నివేదికలో వెల్లడి

ఈనాడు - హైదరాబాద్


కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల పథకం వల్ల ఒనగూరే ప్రయోజనాలను ఎక్కువ చేసి చెప్పారని, వార్షిక ఖర్చులను తక్కువగా చూపారని కంప్ట్రోలర్ ఆండ్ ఆడిటర్ జనరల్(కాగ్) పేర్కొంది. గురువారం శాసనసభలో ప్రభుత్వం కాగ్ నివేదికలను ప్రవేశపెట్టింది. "రూపాయి ఖర్చు పెడితే రూపాయి 51 పైసల ఆదాయం వస్తుందని చెప్పారు. కాగ్ ప్రాజెక్టు తాజా ధరను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే రూపాయి ఖర్చుకు వచ్చే ప్రయోజనం 52 పైసలు మాత్రమే. సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక(డిపీఆర్)లో ధరల పెరుగుదల వర్తింపు సహా

పలు అంశాలను చూపకుండా.. ఆ తర్వాత పెంచారు. దీంతో పనుల విలువ రూ.63,852 కోట్ల నుంచి రూ.1,02,267.99 కోట్లకు పెరిగింది. భూసేకరణ, పునరావాసం.. ఇలా అన్నీ కలిపి ప్రాజెక్టు వ్యయం రూ.81,911 కోట్ల నుంచి రూ.1,47,427.41 కోట్లకు పెరిగింది. దీని ప్రకారం రూపాయి ఖర్చుకు వచ్చే ప్రయోజనం 52 పైసలు మాత్రమే. వాస్తవ ప్రయోజనాలు వచ్చే టప్పుటికి ఇంకా తగ్గవచ్చు. మొదటి అంచనా రూ.81,911 కోట్లలో విద్యుత్ ఛార్జీలు ఎత్తిపోతలకు

యూనిట్కు రూ.6.40 కాగా.. రూ.3గా మేల్కొన్నాయి. దీనిని పరిగణనలోకి తీసుకొంటే రూపాయి ఖర్చు పెడితే వచ్చేది 75 పైసలు. తా.వ్యయాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే మాత్రం 9 టెన్ ఫిట్ రేషియో 1.0.52 మాత్రమే" అని కాగ్ స్పష్టం చేసింది.

...మిగతా 9

కాళేశ్వరంతో పాటు పలు అంశాలపై కాగ్ విశ్లేషణ

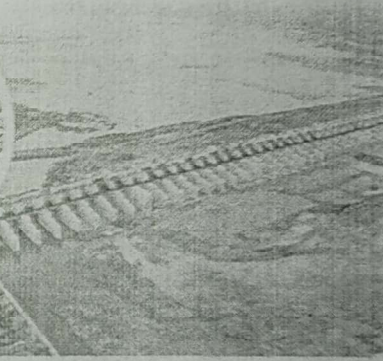

భూకంప అధ్యయనం లకుండానే మల్లన్న సాగర్

ఈనాడు, హైదరాబాద్: కాశీశ్రం ఎత్తిపోతల పథకంలో కీలకమైన, అత్యధికంగా 50 టీఎంసీల సామర్థ్యం కలిగిన మల్లన్నసాగర్ రిజర్వాయర్ను లోతైన భూకంప ప్రభావ అధ్యయనం లేకుండానే నిర్మించినట్లు కాగ్ తప్పుపట్టింది. "దీనికి దీనివే 10.3 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టు ఉంది. రూ.6,128.8 కోట్లతో చేపట్టిన ఈ రిజర్వాయర్ను 2022 డిసెంబరులో ప్రారంభించారు. అంతే ఇప్పటివరకు అత్యవసర కార్యచరణ ప్రణాళిని సిద్ధం చేయలేదు. దీనివల్ల అనకట్టు తెగే సందర్భాలు ఎదురై స్పందించడంలో భాష్యం జరిగితే నష్టం పందోని ప్రజల ప్రాణానం, ఆస్తులకు ప్రమాదం ఉంటుంది" అని కాగ్ హెచ్చరించింది.



నిర్దిష్ట భూకంప అధ్యయనాలను చేయించాలని సెంట్రల్ డిజైన్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ (సీడీఎ) సీనియర్లు అభిప్రాయపడ్డారు. ఆ

హించకుండా జలాశయ నిర్మాణాన్ని కొనసాగించి 95 శాతం పనుల తర్వాత నిపుణులు

అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం మేరకు అయితే ఇప్పటికే సీడీఎ పదేపదే పేర్కొంది. గులను కేంద్ర జల ఇంధన పరిశోధన సంస్థ, రోని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ వంటి సంస్థలతో పరిశీలించబడేయాలని సీడీఎ చీఫ్ ఇంజనీరు సూచించినా నిర్మాణానికి ముందు ఈ పని చేసినట్లు లేవు. అయితే 95 శాతం పనులను పూర్తి తర్వాత రిజర్వాయర్ డిజైన్, ఇతర సాంకేతిక అంశాలపై 2021 జనవరిలో నిపుణుల కమిటీని నియమించారు. భూకంప అధ్యయనాన్ని అత్యవసరంగా జరిపించే చర్యలు, జలాశయాన్ని పూర్తి సామర్థ్య నిల్వ చేసే ముందు అత్యవసర కార్యచరణ ప్రణాళిని సిద్ధం చేసుకోవాలి" అని కాగ్ సిఫార్సు చేసింది.

భూకంప తీవ్రత-6లో రిజర్వాయర్
"2016లో ప్రాథమిక డ్రాయింగ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు స్థాన

ప్రకారం ఎన్టీఆర్ కి రేఖ రాసిన సీనియర్లు అభిప్రాయం అంగీకారం రాకుండానే కాంట్రాక్టర్లకు పనులు ఇచ్చి 2020 డిసెంబరు నాటికి పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టింది. 2018లో ఎన్టీఆర్ ప్రాథమిక నివేదిక ఇచ్చింది. తెలంగాణ భూకంప జోన్-2లో ఉందని తెలిపింది. గత మూడు నాలుగు దశాబ్దాల్లో వచ్చిన భూకంప ప్రభావాలను ప్రస్తావిస్తూ భూకంప తీవ్రత-6లో మల్లన్నసాగర్ జలాశయం ఉందని తెలిపింది. భూకంప ప్రభావంపై లోతైన అధ్యయనం చేయాలని ఎన్టీఆర్ కి సిఫార్సు చేసినా ఎక్కడా సమగ్ర సర్వే నిర్వ

ప్రయోజనాలు ఎక్కువ చేసి చెప్పారు.. ఖర్చులేమో తక్కువ చూపారు

(మొదటి పేజీ తరువాయి)
పలు పనుల్లో గుర్తింపబడిన ప్రయోజనం కలిగించేలా మార్పులు జరిగాయి. కేజుకు రెండు టీఎంసీల నుంచి మూడు టీఎంసీల వరకు ఎత్తిపోతల మార్పు చేయడం తప్పుపట్టింది. దీనివల్ల అదనంగా రూ. 28,151 కోట్ల భారం పడిందని పేర్కొంది. ప్రాజెక్టులో తీవ్రమైన భూకంప ఎత్తిపోతల పథకంగా పునరాకృతి, కాశీశ్రం ఎత్తిపోతల పథకంపై అధ్యయనం చేసి కాగ్ నివేదికలో ముద్రాపడింది.

5,643 యూనిట్లు పెరిగిన విద్యుత్ అవసరం
ఎత్తిపోతల పథకాలకు సరఫరా చేసే విద్యుత్ గత యూనిట్ కు రూ.6.40 కాగా, రూ.3గా పేర్కొన్నారు. ప్రాజెక్టులో ప్రాజెక్టులో పోల్చితే పునరాకృతి తర్వాత లిఫ్ట్ లను నడపడానికి అవసరమయ్యే వార్షిక విద్యుత్ 5,643.39 మిలియన్ యూనిట్లు పెరగగా, విద్యుత్ వినియో

గంపై ఏడా అయ్యే ఖర్చు రూ.3555.34 కోట్లు వేగింది. ఎత్తిపోతల కింద ఉన్న లిఫ్ట్లకు 8,459.11 వాట్ల విద్యుత్ అవసరం. ఇది రాష్ట్రంలో ప్రస్తుత మొత్తం స్థాపిత సామర్థ్యంలో 46.82 శాతం. పూర్తయిన తర్వాత ఏడా 14,344.39 మిలియన్ విద్యుత్ అవసరమవుతుంది. పంపింగ్ సీజన్లో పంపులు ఏకకాలంలో పనిచేస్తే గరిష్ట విద్యుత్ డిమాండ్ 203.02 మిలియన్ యూనిట్లు ఉంటుంది. 2021-22లో రాష్ట్రం మొత్తం వినియోగించిన ఈ సగటు (196.06 మిలియన్ యూనిట్లు) కంటే రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం డాదాపు 60 శాతం విద్యుత్ నుండి కొనుగోలు చేస్తున్న నేపథ్యంలో కాశీశ్రం పలు ఎత్తిపోతల పథకాలకు విద్యుత్ అందించడం లుగా మారనుంది" అని కాగ్ హెచ్చరించింది.

ఏకరా ఆయకట్టుకు సీటి సరఫరాకు విద్యుత్, నిర్వహణ ఖర్చు రూ.46,364

"కాశీశ్రం ఎత్తిపోతల పథకానికి విద్యుత్ ఛార్జీల కింద ఏడానికి రూ.10,374.58 కోట్లు అవుతుంది. నిర్వహణ ఖర్చును చూడే రూ.272.70 కోట్లు కలిపి మొత్తం రూ.10,647.28 కోట్లు దీని ప్రకారం ఏకరా ఆయకట్టుకు సీటి సరఫరా చేయడానికి అయ్యే ఖర్చు, నిర్వహణ ఖర్చు రూ.46,364. ఇలాంటి ప్రాజెక్టు నిర్మాణ ఛార్జీలను రూ.1,47,427.41 కోట్లు చేరడం వల్ల ఏకరా ఆయకట్టుకు పెట్టబడి ఛార్జీలను రూ.6.42 లక్షలు, 169 టీఎంసీల సీటిని సాగుకు వినియోగిస్తున్నట్లు పేర్కొని, ఒక టీఎంసీలో 17,888 ఎకరాలు సాగుతున్నాయని ప్రాజెక్టు నివేదికలో చూపించారు. కానీ, ఒక టీఎంసీలో సాగుయ్యేది 10 వేల ఎకరాలు మాత్రమే. ఉన్న సీటి ఎక్కిన సీటికి సరిపోదు. రిబిట్ అందించడం అసాధ్యం.

డీవీఆర్ ఆమోదం పొందకముందే రూ.25,049 కోట్ల పనులు

కాశీశ్రం ఎత్తిపోతల పథకం సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక(డీవీఆర్) ఆమోదం పొందకముందే రూ.25,049.99 కోట్ల పనులు చేసే 17 పనులను కాంట్రాక్టర్లు ప్రభుత్వం ఇచ్చింది. 2018 జూన్ లో కేంద్ర జలసంఘం ఆమోదం పొందకముందే వీటిని అమలుపరిచి డీవీఆర్ ఆమోదం తర్వాత కూడా పనుల్లో మార్పులు జరిగాయి. డీవీఆర్ ప్రకారం రోజుకు రెండు టీఎంసీలు ఎత్తిపోతల పూర్తి అంది. తర్వాత రోజుకు మూడు టీఎంసీలు ఎత్తిపోతల మార్పు చేయడం వల్ల రూ.28,151 కోట్ల అదనపు భారం పడింది. మొదట ప్రాజెక్టు అంచనాను రూ.81,911.01 కోట్లుగా పేర్కొన్నా. ప్రభుత్వం ప్రాజెక్టు మొత్తానికి పరిపాలనా అనుమతి ఇవ్వకుండా ఏ పనికా పనికి వచ్చేట్టుగా పరిపాలనా అనుమతులు ఇచ్చింది. 2022 మార్చి నాటికి 73 పరిపాలనా అనుమతులు ఇచ్చగా, వీటి విలువ రూ.1,10,248.48 కోట్లు. ప్రాజెక్టును ఏడు లంపలుగా విభజించి పనులు చేపట్టారు. పనుల పురోగతి నెమ్మదిగా ఉంది. 50 కాంట్రాక్టర్లుగా

పనులు అమలుపరిచగా, 12 మాత్రమే పూర్తయ్యాయి. పనులు 3 శాతం నుంచి 39 శాతం వరకు జరిగాయి. మొత్తం పనులను ముగిసేందుకు 2022 మార్చి వరకు 69 శాతం పూర్తయింది. కొన్ని పనులకు ఇంకా భూంి రణ జరిగాల్సి ఉంది. కొన్ని రిజర్వాయర్ల కింద ప్రణాళి వాసం కూడా వేస్తులేదు. కొత్త అయికట్టు 18.26 లక్షల ఎకరాలు కాగా, 2023 మార్చి వరకు 14.89 లక్షల ఎకరాల అయికట్టుకు సంబంధించిన డిస్సిమ్యూటర్ల పనులు నూతన అమలుపరిచారు. పునరాకృతి జరిగిన తర్వాత కూడా 3.43 లక్షల ఎకరాల అయికట్టుకు సంబంధించిన డిస్సిమ్యూటర్ల పనులను అమలుపరిచలేదు. ప్రధాన కాలువల్లో 57 శాతం పూర్తి కాగా, డిస్సిమ్యూటర్లలో 7 శాతం మాత్రమే పూర్తయ్యాయి. 2024 జూన్ నాటికి ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నా. ఇప్పటివరకు జరిగిన పనులను మూడే పూర్తయి పరిపాలనా అనుమతానికి దారా వీళ్లే సమయం ఉంది అని కాగ్ నివేదికలో పేర్కొంది.

రీ-ఇంజనీరింగ్తో 122% పెరిగిన వ్యయం!

- కాశేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై కాగ్ నివేదికతో వెల్లడి
- టెండర్ల తర్వాత ధరల సర్దుబాటుతో అంచనాలు పెరిగాయి
- ప్రాజెక్టు నిర్వహణకు ఏటా రూ.10,647 కోట్లు ఖర్చు అని వెల్లడి

సాక్షి హైదరాబాద్: ఉమ్మడి ఏపీలో రూ.38,500 కోట్ల అంచనాతో ప్రాణహిత-చేవెళ్ల ప్రాజెక్టును చేపట్టగా.. తెలంగాణ వచ్చాక రీ-ఇంజనీరింగ్ ద్వారా కాశేశ్వరం, ప్రాణహిత అనే రెండు ప్రాజెక్టులుగా విభజించడంతో అంచనా వ్యయం రూ.85,651.81 కోట్లకు చేరిందని కాగ్ నివేదికలో పేర్కొంది. అంటే ప్రాజెక్టు వ్యయం 122శాతం పెరిగిందని.. కానీ లక్షిత ఆయకట్టు 52.22శాతమే పెరిగిందని వివరించింది. ఆ తర్వాత కూడా ప్రాజెక్టు పనుల్లో మార్పులు, చేర్పులు చేయడంతో అంచనా వ్యయం రూ.1,47,427.41 కోట్లకు చేరినా.. ప్రయోజనాలేమీ పెరగలేదని పేర్కొంది. కాశేశ్వరంపై 2021-22 ఆర్థిక ఏడాది చివరినాటికి కాగ్ నిర్వహించిన ఆడిట్ నివేదికను ప్రభుత్వం గురువారం అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టింది. నివేదికలోని ముఖ్యాంశాలివీ..

పంపింగ్ పెంచడంతో అదనపు వ్యయం కాశేశ్వరం డిపీఆర్ను 2018 జూన్లో కేంద్ర జలసంఘం ఆమోదించడానికి ముందే రూ.25,049.99 కోట్ల విలువైన 17 పనులను నీటిపారుదల శాఖ కాంట్రాక్టర్లకు అప్పగించింది. తొలుత గోదావరి నుంచి రోజుకు 2టిఎంసీలను ఎత్తిపోయాలని ప్రతిపాదించారు, తర్వాత అదనరం లేకున్నా పంపింగ్ సామర్థ్యాన్ని 3 టీఎంసీలకు పెంచడంతో రూ.28,151 కోట్ల అదనపు వ్యయం అవుతోంది. కాశేశ్వరం ప్రాజెక్టుతో కలిగే ప్రయోజనాలను ఎక్కువ చేసి చూపారు. ఇతర ప్రాజెక్టుల కింద ఒక

టిఎంసీ నీళ్లు 10వేల ఎకరాలకే సరిపోతాయని చూపగా.. కాశేశ్వరం కింద 17,668 ఎకరాలకు అందించవచ్చని లెక్కించారు. తాజా అంచనా రూ.1.47 లక్షల కోట్లలెక్కన చూస్తే.. ప్రాజెక్టు ప్రయోజన-వ్యయ నిష్పత్తి 0.52గా తేలుతోంది. అంటే వెచ్చించే ప్రతి రూపాయికి 52 పైసలే ప్రయోజనం అందుతుంది. ప్రాజెక్టుకు ఏటా విద్యుత్ చార్జీలు, నిర్వహణ కలిపి రూ.10,647.26 కోట్ల ఖర్చు అవుతుంది. ఒక్కో ఎకరాకు సాగునీరు అందించడానికి ఏటా రూ.46,364 లెక్కన వ్యయం అవుతుంది.

చెల్లింపుల వాయిదాతో మరింత భారం

కాశేశ్వరం కార్పొరేషన్ రుణాలను తిరిగి చెల్లించడానికి వచ్చే 14ఏళ్లలో మొత్తం రూ.1,41,544.59 కోట్లు అవసరం కానున్నాయి. కొన్ని రుణాల తిరిగి చెల్లింపు ఇప్పటికే ప్రారంభం కావాల్సి ఉన్నా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాయిదా కోరింది. దీనితో రూ.8,182.44 కోట్ల మేర అదనపు వడ్డీ భారం పడింది. కాశేశ్వరం ప్రాజెక్టులోని 21 ఒప్పందాల పరిధిలో పంపులు, మోటార్లు, అనుబంధ పరికరాల కొనుగోళ్ల కోసం వాస్తవ ధరల కంటే అధికంగా వ్యయాన్ని అంచనా వేశారు. వీటిలోని నాలుగు పనుల్లో కాంట్రాక్టర్లకు రూ.2,684.73 కోట్ల మేర అనుచిత లబ్ధి కలిగే అవకాశాన్ని తోసిపుచ్చలేం. ఐదు ఒప్పందాల్లో టెండర్లు పూర్తయ్యాక ధరల సర్దుబాటుతో అధిక చెల్లింపులు జరిగాయి.

నీరిచ్చింది 40,888 ఎకరాలకే..

ప్రాజెక్టు కింద 18.26లక్షల ఎకరాల కొత్త ఆయకట్టును ప్రతిపాదించారు. ఇందులో 14.83లక్షల ఎకరాల మేర మాత్రమే కాలవల వ్యవస్థను అభివృద్ధి పనులను చేపట్టారు. 2022 మార్చి చివరినాటికి వాస్తవంగా నీళ్లిచ్చింది 40,888 ఎకరాలకే. ఇక మల్లన్నసాగర్ జలాశయం ప్రాంతంలోని భూగర్భంలో నీటారుగా పగుళ్లు ఉన్నాయని, భూకంపాలకు అవకాశం ఉందని నేషనల్ జియోలాజికల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అధ్యయనంలో తేలింది.

కాళేశ్వరం...
వ్యయభారమే!

హైదరాబాద్, ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్యూరో: ఆసియా బడ్డెట్ సమావేశాల్లో భాగంగా గురువారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కాసునపల్లిలో రాష్ట్ర రైల్వే కేంద్రానికి గుర్తు, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పేరిటోర్లో అంది అడిమిరీసంకరం (కాగ్) ఇచ్చిన సీమెట్ కంపెనీ ప్రవేశ పెట్టింది. కాళేశ్వరం ప్రభుత్వం భారీగా ఎరిగినప్పటికీ ప్రయోజనాలు అదనపు సౌకర్యాల చేదను ఈ సీమెట్ కంపెనీ. 2008లో అప్పటి ఉమ్మడి ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో 16.40 లక్షల ఎకరాల కొత్త అయి కట్టుకు సాగునీరు ఉందిచే లక్షలలో రూ.38,500 కోట్లతో చేపట్టిన ప్రాజెక్టు పేరిటోర్ సులభ సేవలలో ఎక్కిపోతల వధ కాన్పు చేపట్టినట్లు సీమెట్ కంపెనీ తెలిపింది. కేంద్ర జలసంఘం మోదీని చేతులదానే 2008-2009 మధ్య కాలం లో ప్రాజెక్టు సులభ సేవలలో కాన్పు చేపట్టిన అప్పటి, వేసులు ప్రారంభించినట్లు తెలిపింది. రాష్ట్ర విద్యుత్ అసంశ్చరం కొత్తగా పురూదిన దీఆపిన కాన్పు దీ ఆపినట్లు ప్రభుత్వం ప్రాజెక్టు పేరిటోర్ ప్రాజెక్టును కాన్పు, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుగా విడిచిచి ఈ రోడు ప్రాజెక్టులు కాన్పు మొత్తం రూ.85, 851.81 కోట్ల అంతు మధ్యమం చేసి మొత్తం రూ.26 లక్షల ఎకరాల కొత్త అయి కట్టుకు సాగునీరు ఉందిచేదంతో కాన్పు. ఇప్పటికే ఉమ్మడి నాలుగు ప్రాజెక్టులను సీమెట్ కంపెనీ ద్వారానే కాన్పుచెసలు మొదలించింది.

[illegible]

నిరర్థకమైన పనులు

కాశ్యపరం ప్రాజెక్టుకు రీ
ఇంజనీరింగ్, మా
ర్పుల వల్ల

భారీగా పెరిగినవృత్తికి.....!

కాశీశ్రద్ధం వ్యయం భారీగా పెరిగినప్పటికీ ప్రయో
 జనార్థం ఆదనవృత్తి పెరుగుదల లేదని, విద్యుత్ వినియోగానికి
 ఏడాది రూ. 3,550 ఆదనవృత్తి వ్యయం పెరిగిందని కాగ్ నివేదిక
 తెలిపింది. అంబాపాలి వారి భరణితో మేయరు డి. పేరిగిన
 దరమి మోకాళ్ళాని తీర్చుకుంటూ డి.పి.ఆర్. ప్రాజెక్టు మునుపే తప్పువ
 డేని చూపాడని తెలిపింది. ఆ తరువాత మార్పులతో ప్రాజెక్టు
 వినియోగ రూ. 69,52 క్లో నుండి రూ. 1,02,267 క్లో క్లబ్బు
 పెరిగిందన్నారు. మునీకేరణ పునరావాసం మిగిలి ఉందని కాగ్
 ఎల్లీ చూపింది. కేంద్ర జలసంఘంలో తెల్లిన నివేదికలో
 రూ. 81,911 క్లో ఉంది తెలిపిందని పేర్కొంది. రూ. 1,
 47,427 క్లోకి మించిపోయే అవకాశం ఉందన్నారు.



కాళేశ్వరానికి కార్తీరేషన్ ద్వారా

రూ. 66,854 కోట్ల అప్పు

కాళేశ్వరం ఒక్క ప్రాజెక్టుకు కార్గోడవన్ ద్వారా 66,854 కోట్లు తీసుకుందని కాగీ నీడేదకలో పేర్కొంది. 14 నం వర్క్ రాలలోగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి రూ.2,52,048 కోట్లు చెల్లిండాల్సి ఉందని బడ్జెట్ కేవలం ఐదర్వయిం ది 77 శాతం మాత్రమేనని పేర్కొంది. రుణాల చెల్లిం పునకు రూ.1,45,546 కోట్లు అవుతుందని చెప్పింది. రాష్ట్రం రెవెన్యూలో టులో ఉంది. ఆ రెవెన్యూ లో మా రెవెన్యూ నుండి తీసుకున్న రుణాల ద్వారా భర్తీ చేయాలి వర్తిస్తుందని పేర్కొంది. డీపీఆర్ లో రూ.63,352 కోట్లు చూపట్టుగా రూ.1,06,000 కోట్లకు అంచనా వ్యయం పంచారని తప్పు బట్టింది. ప్రస్తుత నిర్మాణం వరకు 14 లక్షల ఎకరాలకు ఆయకట్టు ఉంది. మొత్తం ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తయ్యే వరకు రూ.1,47,427 కోట్లు ఖర్చు అవుతుందని ప్రాజెక్టు నుంచి ఆదాపించిన ప్రయోజనాలను ఎక్కువ చూపట్టుకని తెలిపింది. ప్రాజెక్టు వార్షిక ఖర్చులు తక్కువ చూపారని కాళేశ్వరం నీటి అమృతం ద్వారా రూ.1018 కోట్లు ఆదాయాన్ని అంచనా పోగోన పేర్కొంది. ప్రాజెక్టు కోసం భారీగా రుణాలు తీసుకు న్నారని, 15 వ్యాకుం బలో రూ.87 మే కోట్లు నమూనార్కు కోవాలని ఒప్పందం తీసుకున్నారని, బడ్జెట్ తరక రుణాలపై ప్రభుత్వం ఎక్కువ ఆదారపడి ఉందని రుణాలు చెల్లిం పడడంలో కాలయాపన చేసేందని ఆరోపించింది. ప్రాజెక్టు నిర్వహణ కోసం ఏర్పా రూ.70 కోట్ల నుంచి రూ.14,500 కోట్ల వరకు ఖర్చు అవుతుందని అంచనా పోగోన చేసింది. రుణాలు చెల్లిం పడడం కోసం మళ్ళీ అప్పులు చేయాలి వర్తిస్తుందని ఏర్పడిందని, కాళేశ్వరం అప్పు కదులాపోతే 2038లో పూర్తవుతుందని వివరించింది.

అప్పటికే చేసిన కొన్ని పనులు నిర్ధారం అయ్యాయి, రీ ఇంజనీరింగ్, మార్కులు వల్ల రూ. 765 కోట్ల నష్టం వాటిల్లించిన తెలిపింది. పనులు అప్పగించారో నీటి పారుదల శాఖ అనుచిత తొందరపాటు ప్రదర్శించిందని పేర్కొంది. అవసరం లేకున్నా కాళేశ్వరం మూడో టీఎంసీ పనులు చేపట్టారని తప్పు పట్టింది అదనపు టీఎంసీ వల్ల రూ. 25 మేల కోట్లు అదనపు వ్యయం అయిందని, సాగునీటిపై మూలదనం వ్యయం ఒక్కో ఎకరానికి రూ. 6.42 లక్షలు అవుతుందని పేర్కొంది. ఒక్క టీఎంసీలో 17,688 ఎకరాల అయోగిల్లు దస్తుంది అని అంచనా వేశారు. ఇతర ప్రాజెక్టులలో పోల్చితే 10 మేల ఎకరాలకే సరిపెట్టుతుందని పేర్కొంది. కాళేశ్వరం నిర్వహణకు రూ. 10 మేల కోట్లు ఖర్చవుతుందని తెలిపింది. ప్రాజెక్టు ప్రయోజన, వ్యయ నిష్పత్తి 1:51గా అంచనా వేశారు.

- అంచనా భారీ పెరుగుదల • ప్రయోజనాల్లో శూన్యం
- నిర్వహణకు ఏటా రూ. 14 వేల కోట్లు
- రూ. 3,555 కోట్లు విద్యుత్ వ్యయం అదనం
- ఆప్త వడ్డీల భారం... • అదాయం అంతంత
- మాత్రమే • రాష్ట్ర బడ్జెట్ నుంచి చెల్లింపులు
- 'ప్రాణహిత'లో పురోగతి లేదు • రూ. 878 కోట్లు
- నిష్కలం • చాగ్ నివేదికలో వెల్లడి

కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ప్రయోజన, వ్యయ నిష్పత్తి 0.75గా తెలుపబడినది తెలిసింది. ప్రాజెక్టు ప్రయోజన, వ్యయ నిష్పత్తి మరింత తగ్గి అవకాశముందని పేర్కొంది. లోతైన భూకంప సరిబంధిత అధ్యయనాలు చేయకుండానే మల్లన్నసాగర్ నిర్మించారు" అని కాళేశ్వరం నిషేధకలోపేర్కొంది.

కాళేశ్వరప్రాజెక్టులో వచ్చే రాణాలు అధికంగా చూపి, వార్షిక వ్యయం తక్కువ చూపారన్నారు. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు వ్యయం అంతనాకే మొత్తానికి అనుమతి ఇవ్వలేదని స్పష్టం చేసింది. ఒక్కో పరిశోధన అనుమతి ఇస్తూ పోయిందని, కాళేశ్వరం ఇంకాగన ప్రాజెక్టు కార్యోపేక్ష పేరుతో అప్పులు తెచ్చిందన్నారు. రూ.87,448 కోట్ల రాణాలు ప్రభుత్వం తెచ్చిందని తెలిపింది. బడ్జెట్ నుండి వచ్చిన నిధులు కేవలం 217కంటే మళ్లీ మేసిని తెలిపింది. కాళేశ్వరంలో ఆదాయం లేనందున తెచ్చిన ఖర్చు కూడా రూపాయలు రాణాలు చెల్లించడం కష్టమని కాకా హక్కురకలు జారీ చేసింది. దీంతో బడ్జెట్లో మోయాలని భారం పడుతుందని చెప్పింది.

2020-21 లోనే రుణాల చెల్లింపు ప్రారంభం కావాల్సి ఉందని, కానీ ఆ గ్రామంలోని వాయిదా చేయాలని కోరిందన్నారు. దీంతో వడ్డీల భారం రూ. 8,182 కోట్లు అదనంగా పడిందన్నారు. కాశీఖరం కోసం తెచ్చిన రుణాల రూ. 1690 కోట్లు ముగిసారని తెలిపారు. అదనంగా రూ. 587 కోట్లు వడ్డీ పడిందన్నారు. ఏడాది రూ. 14,462 కోట్లు రుణాల చెల్లింపు, వడ్డీకి కట్టించాల్సి ఉందని, కాశీఖరం పనుల్లో 56 పనుల్లో 13 పూర్తి అయ్యాయని కాగి పేర్కొంది.

ప్రాణహిత ప్రాజెక్టులో వురోగతి లేదు...

నిష్పలంగా రూ. 878 కోట్లు

ప్రాణహిత ప్రాజెక్టుల ఎలాంటి పురోగతి లేకపోగా దీనికోసం కేటాయించిన రూ.878 కోట్లు నిష్పలమయ్యాయని కాక పేర్కొంది. ఇంజనీరింగ్ పేరుతో డబ్బులు వృధా చేశారన్నారు. ప్రాణహిత హింద్. 2022 మార్చి నాటికి రూ.1727 కోట్లు చేయగా, కాక శ్వరంపై రూ.86,788 కోట్లు ఖర్చు పెట్టారని తెలిపింది. కాక శ్వరంపై కంప్యూటర్ గ్రాఫ్ సమస్యలు, నిల్వ సామర్థ్యం, సౌకర్యంపై నైపుణ్యం లేదని కాక విత్తించింది. ప్రాజెక్టు పనులు అస్తవ్యస్తంగా ప్రారంభించారని తెలిపింది. మహారాష్ట్రలో ముంపు సమస్యను కాక విత్తించింది. ప్రాజెక్టు వ్యయం 122 శాతం పెరిగింది కానీ ఆయిట్లు 52 శాతం మాత్రమే పెరిగిందన్నారు.

రిజర్వు బ్యాంకు నుంచి చెబుదున్న కింద రూ. 67.17 కోట్ల అదన వ్యయమైందని, 2022 మార్చి 31 నాటికి రాష్ట్రంలో 83 రాష్ట్ర ప్రభుత్వరంగ సంస్థలు మూడు చట్టబద్ధమైన కార్పొరేషన్లు ఉన్నాయుంది. అందులో 8 విద్యుత్ రంగానికి చెందినవి కాగా మిగిలావి విద్యుత్తరక రంగాలు 2022 మార్చి 31 నాటికి 39 ప్రభుత్వానికి సంస్థలు తీవ్ర స్థాయిలో ఉన్నాయి. 2020 సంవత్సరానికి సంబంధించి 67 ప్రభుత్వరంగ సంస్థల్లో కేవలం 12 మాత్రమే రాజధాన్య ఉన్నాయని తెలిపింది. మిగిలావి స్థాయిలో ఉన్నాయని కాక కడిగింది. 32 కార్పొరేషన్లు వాటి పద్ధతి నివేదికలను ఆశించిన విధంగా సమర్పించడం లేదని తెలిపింది.

[illegible]

Annexure -2

④

తనిఖీలు చేసే దిక్కు లేదు

2023 అక్టోబర్ 21న మేడిగడ్డ బ్యారేజీ కుంగిపోవడానికి డిజైన్ తోపాటు పాటు అపరేషన్ అండ్ మెయింటనెన్స్ సుగారికి వదిలేయడమే కారణమని నేషనల్ డ్యామ్ సీఫ్టీ అథారిటీ నిర్ధారించిందని కాగ్ తెలిపింది. "వర్షా కాలం ప్రారంభానికి ముందు, ముగిసిన తర్వాత బ్యారేజీల వద్ద కనీస తనిఖీలు చేపట్టలేదని, 2019లోనే లోపాలు బయట పడినా వాటికి రిపేర్లు చేయకపోవడంతో బ్యారేజీ కుంగిందని డ్యామ్ సీఫ్టీ అథారిటీ పేర్కొంది. అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీలోనూ లోపాలు ఉన్నాయని గుర్తించింది" అని కాగ్ తన నివేదికలో వెల్లడించింది.



కాళేశ్వరం

లోపాల వృత్తులు

ఇష్టారీతిగా డిజైన్లు, నిర్మాణాలు.. కాంట్రాక్టర్లకు ఉత్తప్రణాళికి చెల్లింపులు నివేదికలో కడిగిపారేసిన కాగ్ .. అసెంబ్లీ ముందుకు రిపోర్ట్


ప్రాజెక్టు వ్యయం రూ.63,352 కోట్ల నుంచి 1,02,267 కోట్లకు పెంచారు ఇంకా చేపట్టాల్సిన పనులను కలిపితే ఇది రూ.1,06,187 కోట్లయితే భూకంప జోన్ లో మల్లన్నసాగర్ కట్టారు.. ఎన్ జీఆర్ ఐ చెప్పినా వినలే వంపులు, మోటార్ల కొనుగోళ్లలోనే రూ.2,600 కోట్ల అక్రమాలు కాళేశ్వరం లోన్ల రీపేమెంట్లు, ఇతర ఖర్చులకు షటా.రూ.24 వేల కోట్లు ఖర్చు ఇందులో కరెంట్ బిల్లులకే ఏటా రూ.10 వేల కోట్లు.. అప్పుల భారం రాబోయే 11 ఏండ్లు భరించాల్సిందే

హైదరాబాద్, వెలుగు:

కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మొత్తం లోపాల పుట్టే నని కంప్యూటర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ (కాగ్) తేల్చేసింది. మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీల డిజైన్లలోనే లోపాలున్నాయని, 2019లోనే మేడిగడ్డ దెబ్బతిందని వెల్లడించింది. భూకంప జోన్ లో మల్లన్నసాగర్ ను నిర్మించారని, ఇక్కడ కనీసం సర్వే చేయ కుండానే రూ.6 వేల కోట్లకు పైగా ప్రజాధ గుం ఖర్చు చేశారని పేర్కొంది. కేవలం కాళేశ్వరం వంపులు, మోటార్ల కొనుగోళ్లలోనే రూ.2,600 కోట్ల అక్రమాలు జరిగాయని, కాంట్రాక్టర్లకు అనుచిత లబ్ధి చేకూర్చారని తప్పుబట్టింది. డీపీఆర్ ఓకే కాకముందే కాంట్రాక్ట్ గొప్పకు రూ.25వేల కోట్ల పనులు అప్పజెప్పారని తెలిపింది. కాళేశ్వరంపై కాగ్ రూపొందించిన నివేదికను గుర్తువారం అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టారు. డీపీఆర్ డ్రీమ్ ప్రాజెక్టుగా దెబ్బకుంటున్న ఈ కాళేశ్వరంలో

అడుగడుగునా లోపాలు ఉన్నాయని, 52 సైసల ఆదాయానికి ఏకంగా ఒక్క చూపాయి ఖర్చు చేశారని కాగ్ తీవ్రంగా తప్పుబట్టింది. ప్రాజెక్టు కాన్స్ట్రక్షన్ డివీజన్ రేషియోను ఎక్కువ చేసి చూపించారని, అసలు ప్రాజెక్టు డ్వారా నమకూరే అధాయమే తక్కువ కాబట్టి అప్పులు, వడ్డీల భారం మొత్తం ప్రభుత్వ ఖజానా నుంచే చెల్లించాల్సి ఉంటుందని, ఇది గుదిబంద అని పేర్కొంది. కరెంట్ బిల్లులకే ఏటా రూ.10 వేల కోట్లకు పైగా ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుందని తెలిపింది. లోన్ల రీపేమెంట్లు, ఇతర ఖర్చులు లెక్కేనే ఏటా ఈ ప్రాజెక్టు కోసం దాదాపు రూ.24 వేల కోట్లు ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుందని, ఇట్లు 2035 సంవత్సరం వరకు చెల్లించాల్సి ఉంటుందని పేర్కొంది. ప్రాజెక్టు కోసం తీసుకున్న లోన్లను కూడా దారి మళ్లించారని కాగ్ తన నివేదిక లో తప్పుబట్టింది.

మగతా 4వ

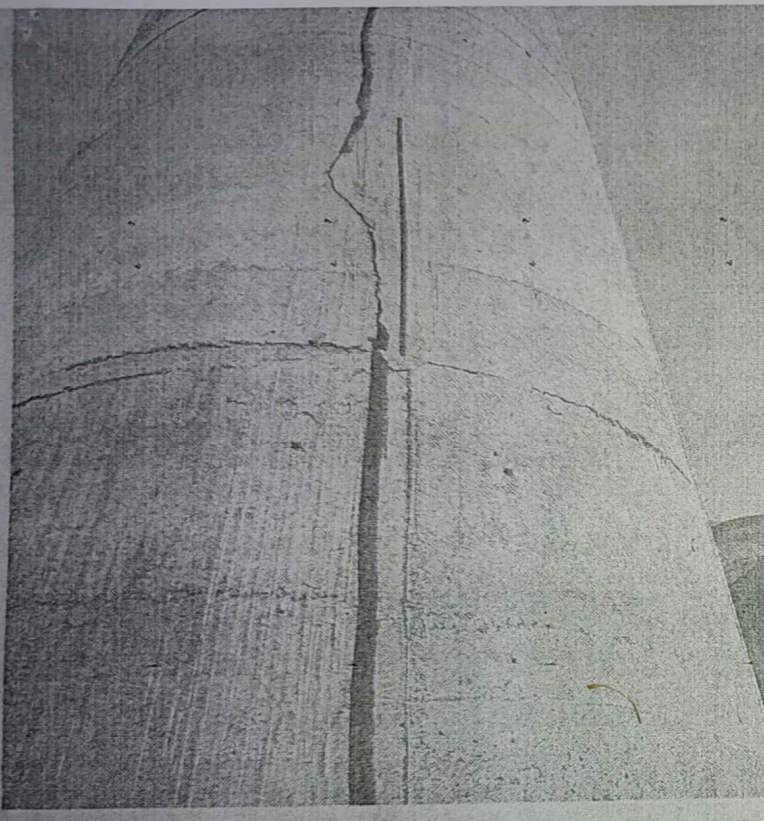

నిట్టనిలుపుగా చీలిన
మేడిగడ్డ పిల్లర్

పిల్లర్లు కుంగడంతో
నెర్రెలిచ్చిన బ్యారేజ్

కాళేశ్-శ్చేరం మొత్తం

లోపమోల వుట్టలు

(మొదటి పేజీ తరువాయి)

కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో ప్రధాన బ్యారేజీ నిర్మాణం వ్యయం మూడేండ్లలోనే డబ్బల్ అయిందని కాగ్ తెలిపింది. 2016 ఆగస్టులో రూ.1,849.31 కోట్లు అంచనాలో వసూలును అప్పగించగా... నిర్మాణం పూర్తయ్యే సరికి ఖర్చు రూ. 4,321.44 కోట్లకు పెంచేశారని, అగ్రిమెంట్ కోపోల్టికే ఖర్చు రూ.2,472.13 కోట్లు పెంచేశారని తెలిపింది.

కాగ్ అంధ్రప్రదేశ్ ని ముగ్గు కీలక లంకాలు

- ప్రాజెక్టు - చెవెళ్ల ప్రాజెక్టులోని 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 21 ప్యాకేజీలను ి ఇంజనీరింగ్ చేయడంతో ఆప్పటికే చేపట్టిన పనులకు చేసిన ఖర్చు రూ. 428.91 కోట్లు వృథా అయ్యాయి. 23 నుంచి 26 ప్యాకేజీలను, తొలగించడంతో ఆక్కడ ఖర్చు చేసిన రూ.170.59 కోట్లు వృథా అయ్యాయి. ప్యాకేజీ -5లో ఖర్చు చేసిన రూ.168.28 కోట్లలో కొంత వృథా అయింది.
- రీ ఇంజనీరింగ్ తర్వాత మల్లన్న సాగర్ పంపు హౌస్, నక్ట్ ఫాలో ను 5.5 కి.మీ.ల దూరం మార్చడంతో ఆప్పటికే ఖర్చు చేసిన రూ.174.19 కోట్లు వృథా అయ్యాయి.
- తుమ్మడిపాల్వే నుంచి ఎల్లంపల్లికి నీటిని తరలించేందుకు చేపట్టిన పనులను సింగరేణి సంస్థ అత్యంత రింకో ఇవో ప్యాకేజీ వర్గ నిలిపి వేశారు. ఆ పనులను ఏ ఇతర అవసరాలకు వీనియోగించకపోవడంతో రూ.767.78 కోట్లు వృథా అయ్యాయి.
- రాష్ట్ర స్థాపిత విద్యుత్ సామర్థ్యంలో ఈ ఒక్క కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకే 46.82 శాతం ఇవ్వాలి ఉంటుంది.. అది సాధ్యం కాదు కాబట్టి ప్రాజెక్టుకు అవసరమయ్యే కరెంట్ లో 60 శాతం బయటి నుంచే కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది.
- అవసరం లేకున్నా అడిషనల్ టీఎస్ఎస్ పనులు చేపట్టి రూ.28.151 కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నారు. ఇరిగేషన్ రి కాల్కులో, పనుల అంశాలలో పంపింగ్ కెపాసిటీ పెంపు అవసరంపై విశ్లేషణ చేస్తున్నారని తెలుస్తోంది.
- కాళేశ్వరం వ్యయం రూ.63,352 కోట్లు నుంచి రూ.1,02,267.99 కోట్లకు పెరిగింది. ఇంకా చేపట్టాల్సిన పనులను కలుపుకుంటే ఈ మొత్తం రూ.1,06,187.15 కోట్లకు చేరుతుంది. సీద డ్లాగ్ నీడు అప్రోప్రీ చేసే ప్రాజెక్టు నిర్మాణ వ్యయం (రూ.81,911.01 కోట్లతో పోలిస్తే ప్రాజెక్టు అంచనాలు రూ.1,47,427.41 కోట్లకు మించి పోయే అవకాశం ఉంది.
- కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుగా రీ ఇంజనీరింగ్ చేయడంతో ప్రాజెక్టులో కోసం అప్పటికే చేసిన రూ.767.78 కోట్లు వృథా అవుతుంది.
- ప్రాజెక్టు - చెవెళ్ల ప్రాజెక్టు లో భాగంగా ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాలో 2.47 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టు ప్రతిపాదించగా కాళేశ్వరంలో అది 50 వేల ఎకరాల కు తగ్గింది.
- ప్రాజెక్టు పనులను కాళేశ్వరంలో కలపడానికి అక్కల్లాం చూపిన ఆగ్రహం దివ్యమంటే, 2018లో ఈ ప్రాజెక్టు డివైల్ ను సీద డ్లాగ్ అమోదించడానికి ముందే రూ.25,049.99 కోట్ల పనులను కాంప్లెక్టర్లకు అప్పగించింది.

ఇంజనీర్లు చెప్పినా వివరాలు..!

మడిగడ్ల బ్యారేజీ డివైల్ కెపాసిటీ 80 వేల క్యూమెక్యులత్, అన్నారం డివైల్ కెపాసిటీ 65 వేల క్యూమెక్యులత్, ముందగ్గ డివైల్ కెపాసిటీ 57 వేల క్యూమెక్యులత్ డివైల్ చేశారు. వీటికి ఇరిగేషన్ డివైల్ మెంట్ పరిధిలోని సెంట్రల్ డివైల్స్ అర్గ్ నైజ్ వన్ సిఈ అమోదం తెలిపారు. 2019లో వర్ష కాలం తర్వాత నవంబర్ లో బ్యారేజీల గేట్లు మూసిన తర్వాత అర్గ్ సీ వియిరింగ్ కట్ట, సీసీ కర్వెన్ వల్, బ్యారేజీ దిగువన ఉన్న సీసీ బ్లాకులు నదిలోకి కొట్టుకుపోయి రూ.180.39 కోట్ల వృథా వాటిల్లిందని కాగ్ తెలిపింది. బ్యారేజీల నిర్మాణ వరద సామర్థ్యం మేరకు ఆయా నిర్మాణాలు చేపట్టకపోవడంతో కొట్టుకుపోయాయని, వాటిని సరి చేయాలని నిర్మాణ సంస్థలను ప్రాజెక్టు ఇంజనీర్లు కోరగా.. ఆయా పనులు చేపట్టడానికి వర్గ్ పేజీలు ముందుకు రాలేదని పేర్కొంది. డివైల్ మెంట్ ఇచ్చిన డివైల్స్ ప్రకారమే తాము పనులు చేశామని, పైగా వాటికి క్యాలిబ్రే సర్టిఫికేట్లు కూడా ఇవ్వాలి చేశారని విజెస్సెలు తెలిపాయని రిపోర్టులో కాగ్ వివరించింది. ఇంజనీర్లు వాటి పునరుద్ధరణకు రూ.470.03 కోట్లతో అంచనాలు రూపొందించారని.. లాంటింగ్ అప్రాన్లు, సీసీ బ్లాకులు లోపమయి వచ్చేసిన డివైల్స్ లో నిర్మించడంతోనే వాటి నిర్మాణ వ్యయం వృథా అయిందని తప్పుబట్టింది.



- కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు 21వ ప్యాకేజీలోని మాసాని చెరువు నుంచి పడకంటి, మంచిపల్లి, కొండెం చెరువులకు నీళ్లు తరలించి అక్కడి నుంచి 1.84 లక్షల ఎకరాలకు కాల్యం ద్వారా నీరు అందించేందుకు రూ.940.14 కోట్లతో ప్రతిపాదనలు చేశారు. ప్రైవేట్ ఇరిగేషన్ సిస్టం (ప్రైవేట్ ద్వారా నీటి తరలింపు)ను ఇక్కడ అమలు చేయడం ద్వారా రూ.2,248 కోట్లకు ఖర్చు పెంచారు. కాల్య వందేండ్ల పాటు సేవలందిస్తే, ప్రైవేట్ లైసెన్స్ లైన్ 30 ఏండ్లు మాత్రమే. తద్వారా ఇక్కడ ఖర్చు చేసే మొత్తం భారంగా మారుతుంది. సబ్ స్టేషన్లు, ఇతర ఖర్చులను కలుపుకుంటే 21వ ప్యాకేజీ వ్యయం రూ.3,321 కోట్లకు పెరిగింది.
- ప్రాజెక్టులోని 10, 11, 12 ప్యాకేజీలను కాళేశ్వరంలోని లింక్ -4లో భాగంగా మార్చారు. 2019లో రూ.12,594.78 కోట్లతో ఈ పనులకు అమోదం తెలుపగా.. తర్వాత రూ.14,402 కోట్లకు అంచనాలు పెంచారు. తద్వారా రూ.1,807.22 కోట్ల ఖర్చు పెరిగింది.
- సొరంగాల రైఫ్ట్ లైన్ వందేండ్లు. కిలోమీటర్ సొరంగం తవ్వకానికి రూ.86 కోట్ల నుంచి 91 కోట్లు ఖర్చవుతుంది. ప్రైజర్ మెయిన్ (ప్రైవేట్ లైన్) లైన్ 30 ఏండ్లు మాత్రమే. ప్రైజర్ మెయిన్ నిర్మాణానికి కిలోమీటర్కు రూ.225 కోట్ల నుంచి 251 కోట్లు ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో సొరంగాలకు బదులుగా ప్రైజర్ మెయిన్ నిర్మాణాలు చేపట్టడంతో రూ.3,726.91 కోట్లు అదనంగా ఖర్చు చేయాల్సి వచ్చింది.
- గోదావరిపై ఉన్న శ్రీరాం సాగర్ ప్రాజెక్టుకు కాళేశ్వరం నుంచి రివర్స్ ఫ్లోపింగ్ చేయడానికి ప్రతిపాదించిన ఎస్సార్ డివైల్ పునరుద్ధరణ ప్రాజెక్టు సమర్పించుకోలేనిది. ఇలా ఎస్సార్ డివైల్ ఏటా 60 టీఎస్ఎస్ లను లిఫ్ట్ చేయడానికి రూ.141.52 కోట్ల కరెంట్ బిల్లులు అదనంగా వెల్లిందాల్సి వచ్చింది. ఈ ప్రాజెక్టు కోసం రూ.1,999.56 కోట్లు ఖర్చు చేయడం కూడా సమర్థనీయం కాదు.
- రంగనాయక్ సాగర్ నుంచి కొండపోతమ్మ సాగర్ కు మల్లన్న సాగర్ మీదుగా కాల్య తవ్వడానికి 2018లో రూ.44.42 కోట్లతో పనులు చేపట్టగా 2020 మార్చిలో పని పూర్తి చేసే నాటికి వ్యయం రూ.60.22 కోట్లకు పెరిగింది. ఈ కాల్యకు నీళ్లు ఇవ్వడానికి రూ.2.83 కోట్లతో తాము, ఇతర నిర్మాణాలు చేశారు. మల్లన్న సాగర్ నిర్మాణం పూర్తి కావడంతో ఆ కాల్య అందులో మునిగిపోయి రూ.63.05 కోట్లు వృథా అయ్యాయి.
- కాళేశ్వరంతో పాటు తెలంగాణలోని ఇతర లిఫ్ట్ స్కీములకు కరెంట్ అవసరాలు, ఇతర రంగాల కరెంట్ అవసరాలు తీర్చేందుకు ప్రభుత్వం దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికలు అమలు చేయాలి.
- కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కింద 18,25,700 ఎకరాలు సాగులోకి తెస్తామని ప్రతిపాదించినా 14,82,552 ఎకరాలకు నీళ్లు ఇచ్చేలా డిస్ట్రిబ్యూటర్ నెట్ వర్క్ ప్రతిపాదించారు. మిగిలిన 3,43,148 ఎకరాలకు నీళ్లు అందించే వ్యవస్థను ప్రతిపాదించాల్సి ఉంది.
- కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతలకు అవసరమైన ట్రాన్స్ మిషన్ లైన్లు, సబ్ స్టేషన్లు నిర్మాణానికి రూ.2,885.84 కోట్లు ఖర్చవుతాయని డివీఆర్ లో పేర్కొన్నా పెరిగిన లిఫ్ట్ లతో ఈ వ్యయం రూ.6,594.02 కోట్లకు పెరిగింది.
- డివీఆర్ ప్రకారం ప్రాజెక్టు కోసం 1,06,751 ఎకరాల భూమి సేకరించాల్సి ఉండగా ఇందుకు రూ.6,953.65 కోట్లు కేటాయించారు. 2022 మార్చి నాటికి 63,972.16 ఎకరాలు సేకరించారు. ఇందుకోసం రూ.5,510.32 కోట్లు ఖర్చు చేశారు. నగటున ఒక్కో ఎకరానికి రూ.8.61 లక్షల ధర చెల్లించినా మిగిలిన 42,778.84 ఎకరాలు సేకరించేందుకు ఇంకా రూ.3,683.26 కోట్లు అవసరం. కొత్తగా నిర్మించే ఇరు రిజర్వాయర్లలో 20 గ్రామాలు ముంపునకు గురవుతుండగా ఆయా గ్రామాల్లోని నిర్వాసితుల పునరావాసం, ఇతర పనులకు రూ.1,464.34 కోట్లు కేటాయించారు. 2022 మార్చి నాటికి ఆర్ అండ్ ఆర్ కోసం రూ.1,238.60 కోట్లు ఖర్చు చేశారు. మిగతా గ్రామాల్లో ఆర్ అండ్ ఆర్ అమలు కోసం రూ.409.77 కోట్లు అవసరమని లెక్కగట్టగా ఇది ఇంకో రూ.200 కోట్లు పెరిగవచ్చు.
- కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నుంచి 180 టీఎస్ఎస్ లు ఎత్తి పోయడానికి 14,687.83 మిలియన్ యూనిట్లు కరెంట్ అవసరం కాగా ఒక్కో యూనిట్ కు రూ.3 ఖర్చవుతుందని డివీఆర్ లో ప్రతిపాదించారు. లిఫ్ట్ లకు ఒక్కో యూనిట్ కు రూ.6.40కు కరెంట్

50 టీఎంసెల కెపాసిటీ తో నిర్మించిన మల్లన్న సాగర్ ప్రాంతంలో ఎన్ జిఆర్ఐ ప్రాథమిక సర్వేలో డివీ సివిడ్ వెర్రికల్ ఫార్ట్ (లోతులో నిటారు చుట్టు) ఉన్నట్లుగా తేలింది. ఇక్కడ భూకంప ప్రమాదం స్పష్ట చేయాలని ఎన్ జిఆర్ఐ 2016 ఆగస్టులోనే ఇలిగేషన్ డివార్ట్ పండుకు సూచించింది. పూర్తి స్థాయిలో అధ్యయనం చేయకుండానే ప్రభుత్వం ఈ బ్యారేజీ నిర్మాణానికి రూ. 6.126.80 కోట్లు ఖర్చు చేసింది. దక్షిణ భారతదేశం భూకంప జోన్-2 (అతి తక్కువ భూకంప ప్రమాదం ప్రాంతం)లో ఉంది. అయినా సమగ్రమైన అధ్యయనం చేపట్టకుండా పనుల విషయంలో ముంగుక్కోడ్డిని ఎన్ జిఆర్ఐ అప్పట్లో సూచించింది. 1967లో కోయినా భూకంపం, 1993లో లాచూరు భూకంపం, ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ఒంగోలులో వచ్చిన భూకంపం, 1969లో భద్రాచలం వద్ద 1983లో హైదరాబాద్ సమీపంలో మేడ్చల్ వద్ద వంధుపంచన భూకంపాల తర్వాత దక్షిణ భారతదేశంలోనూ వాటి తీవ్రత అధికంగా ఉంటుందని, వస్త్రం భారీగానే ఉండమందని ఎన్ జిఆర్ఐ హెచ్చరించింది. మేడ్చల్ మిల్లన్న సాగర్ నిర్మాణ ప్రాంతం నుంచి 20 కి.మీ.ల దూరంలో ఉందని అర్థమైంది. ఎన్ జిఆర్ఐ ఇంత చెప్పినా... భూకంప జోన్ లోనే మల్లన్న సాగర్ ను కట్టారని కాగ్ అక్రమించింది.

సెక్యూరిటీ డెవలపర్లు, డిజైన్ అర్కిటెక్ట్ కరెంట్ విజువల్
వారు రూ.4,14,80 కోట్లగా పేర్కొనగా అది
రూ.9,40,21 కోట్లకు పెరుగుతుంది. కరెంట్ విజ్
వివరాలను కలుపుతుంది ఇది రూ.10,374.56
కోట్లకు చేరింది.
కాశీశ్రం ప్రాజెక్టు వ్యయం రూ.80 వేల కోట్ల వద్ద
కాశీ బెసిన్ట్ రెవెన్యూను ఒక రూపాయి భర్త
చేస్తే రూ.1.51 ఆదాయం సమకూరుతుందని
చూపించారు. కానీ, ప్రాజెక్టు నిర్మాణ వ్యయం బాగా
పెరగడం, అవసరం లేకున్నా అడిషనల్ డిమాండ్
పనులు చేపట్టడంతో రూపాయి భర్తను చేస్తే 52
పేజీల ఆదాయం మాత్రమే సమకూరుతుంది. ప్రాజెక్టు
డిమాండ్ రూ.కాశీశ్రం సీటిలో వంట ఉత్పత్తులను
రక్షిస్తున్నాగా పెంచి చూపించారు. వరి దిగుబడి 4
పందల కాశం, మొక్కజొన్న, జొన్న ఉత్పత్తి 300
కాశానికి పైగా, పెసలను, టినుములు 120 కాశం
సోదా 122 కాశం, పత్తి 133 కాశం, పేరుకనగ
166 కాశంగా ఉంటుందని డిజైన్ అర్కిటెక్ట్ పేర్కొన్నారు.
కాశీశ్రం ప్రాజెక్టు అవరోహణ అండ్ మెయింటెనెన్స్
కోస్ట్ ఏడా రూ.22,70 కోట్లు భర్తను దేయాలి
ఉంటుంది. 2024 -25లో కాశీశ్రం లోని
రేవెన్యూలో, కరెంట్ బిల్లులు, టి అండ్ ఎంపి కలిపి
రూ.25,109.41 కోట్లు చెల్లించాలి ఉంటుందని
కాశీ పేర్కొంది.

● కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కోసం కేటగిరీసీవర్‌ద్వారా 2022 మార్చి నాటికి రూ. 87,449.15 కోట్ల రోస్తు బ్యాంకులు, అధిక సంస్థల ద్వారా తీసుకు నేందుకు అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారు. ఈ రోడ్డుకు 7.8 శాతం నుంచి 10.9 శాతం వడ్డీ చెల్లింప లా అగ్రిమెంట్లలో పేర్కొన్నారు. 2022 మార్చి నాటికి రూ. 64,283.40 కోట్ల రుణం తీసుకు న్నారు. ఇలా తీసుకున్న రోడ్డు రే పేమెంట్లకు వాయిదా వేయడంతో అదనపు వడ్డీ భారం రూ. 8,182.44 కోట్ల అవుతుంది. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కోసం విజయ బ్యాంకు నుంచి తీసు కున్న రూ. 1,500 కోట్లను దారిమళ్లించారని కాగో తప్పుబట్టింది. కాదా (కమౌండ్ ఏరియా డెవలప్‌మెంట్ అథారిటీ) అప్పటికే సేకరించిన 19,570 ఎకరాల భూమిని కాళేశ్వరం ప్రాజె క్టుకు బదలాయించారని తెలిపింది. రోస్తు తీసు కున్న మొత్తాన్ని అప్పటికే సేకరించిన భూమికి ఖర్చు చేసినట్లుగా చూపించారని, నాలుగోండ్ల యినా ఆ భూమిని వినియోగించలేదని, రోస్టు ను మళ్లించడంతో రూ. 587.65 కోట్ల వడ్డీ భారం పడిందని పేర్కొంది.

● నాదార్ నుంచి తీసుకున్న రూ. 190.09 కోట్ల

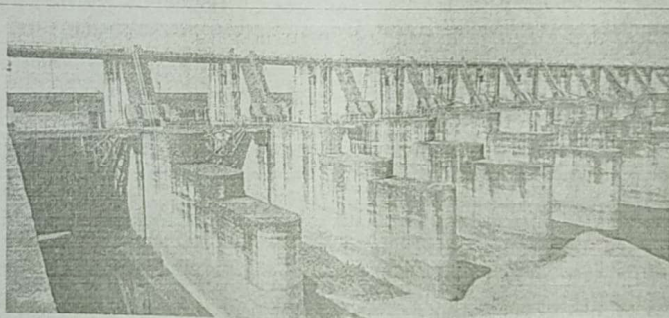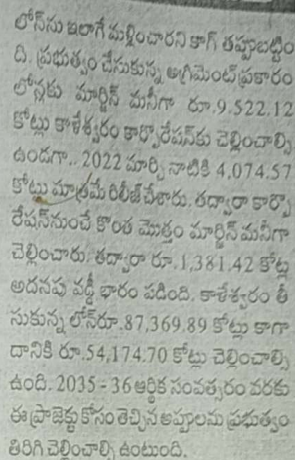

- కాశీశ్రవం నాలుగో లింక్ లోని టన్నెల్ నిర్మాణం కోసం అగ్రిమెంట్ కు మించి కాంట్రాక్టర్ కు రూ. 62.82 కోట్లు చెల్లించారు.
- రీ ఇంజనీరింగ్ : తర్వాత ప్యాకేజీ - 14: పూర్తిగా పక్కన పెట్టారు. అప్పటికే ఆ ప్యాకేజీకి బిందర్బాసి వీలవీ కాంట్రాక్టర్ కు మొదటి చెల్వన్న అడ్వాన్స్ చెల్లించారు. కాంట్రాక్టర్ డిమాండ్ మెంట్ కు రూ. 31.04 కోట్లు బ్యాంక్ గ్యారంటీ గా ఇచ్చారు. ఆ మొత్తం నగదుగా మార్చుకోలేదు.
- బాజెటర్ - డివైజర్ రీ ఇంజనీరింగ్ తర్వాత 21, 24, 25, 26 ప్యాకేజీలను పూర్తిగా తొలగించారు. ఆయా ప్యాకేజీలకు కాంట్రాక్టర్లకు ఇచ్చిన మొదటి చెల్వన్న అడ్వాన్స్ రూ. 64.05 కోట్లకు గాను రూ. 44.57 కోట్లు మాత్రమే తిరిగి రాబట్టారు. మిగతా రూ. 19.48 కోట్లు కాంట్రాక్టర్ల నుంచి రాబట్టలేకపోయారు.
- ప్యాకేజీలు 6, 8, 10, 11, 12 కింద సివిల్, ఎలక్ట్రిక్, హైడ్రో సెక్యూరిటీ పరిశీలన కోసుగోలు, అయా వనరులు 13 విండ్ పావ్ టి అండ్ ఎం కోసం ముందస్తుగా రూ. 70.26 కోట్లు చెల్లించారు. వాటిలో 2022 జనవరి నాటికి రూ. 47.26 కోట్లు మాత్రమే కాంట్రాక్టర్ల నుంచి రాబట్టారు.

- సిమెంట్, గ్రీట్, షెడ్యూల్, ఆయిల్ ఇతర మెటీరియల్ లో ధరల వ్యత్యాసం పేరుతో కాంట్రాక్టర్లకు రూ.529.39 కోట్లు చెల్లించారు. ఇందులో రూ.16.91 కోట్లు అదనపు చెల్లింపులు చేశారు. ప్యాకేజీ-9లోని డివైలర్ తో కాంక్రీట్ బ్యాకీ పిల్ చేయకుండా నమలను వదిలేశారు. కాంట్రాక్టర్ నుంచి అవసరకు చేయూర్చిన వ్యయాలన్నీ రాండ్లూరి, ఇలారూ, 8.29 కోట్లు రాబట్టలేకపోయారు. ఇదే ప్యాకేజీలో కాంట్రాక్టర్ ఏట్లపై మేరకు రూ.26.34 కోట్లు అదనంగా చెల్లించారు. తద్వారా కాంట్రాక్టర్ కు అనుచిత లబ్ధి కలిగించారు.
- మేగిగిడ్ బ్యాకీ అడ్వోక్ రోడ్డు పనుల నిర్మాణ వ్యయం రూ.66.29 కోట్లు పెరుగగా ఇందులో 2022 జనవరి వరకు రూ.44.42 కోట్లు చెల్లించారు. ఇలా అవసరమైన చెల్లింపులు చేసి కాంట్రాక్టర్ కు లాభం చేశారన్నారు.
- ప్యాకేజీ-9లోని గొప్పపల్లి రోడ్డు 29.50 కి.మీ. లుగా పేర్కొనగా 24.92 కి.మీ.లు మాత్రమే పనులు చేశారు. కానీ హార్డ్ కాలివకు చెల్లింపులు చేశారు. తద్వారా రూ.5.69 కోట్లు అదనంగా చెల్లించారు. పై వివరాలన్నీ కాగితంపై మాత్రమే చెప్పబడినవి.

కాళేశ్వరం ఖర్చులో సగం వేగం

- టీఎంసీలో మారిన కాళేశ్వరం
- రూపాయిలో 48 పైసలు వృద్ధి
- 72% నిధులు అప్పుల ద్వారానే
- ఏటా విద్యుత్ కే రూ.10,647 కోట్లు
- ప్రతి ఎకరాకూ రూ.46,364 ఖర్చు
- థర్డ్ టీఎంసీపై కేంద్రానికి నో ఇన్ వేస్మెంట్
- కాగ్ రిపోర్ట్ వెల్లడి

24. తెలంగాణ బ్యూరో : టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం గొప్పగా చెప్పుకునే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నిజస్వరూపాన్ని కాగ్ (కాంగ్రెస్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ రిసెర్చ్) బట్టబయలు చేసింది. ఆ ప్రాజెక్టు డిజైన్ మొదలు నిర్మాణం వరకు అనేక లోపాలు ఉన్నట్లు వెల్లడిచేసింది. అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాల్లో 260 పేజీల నివేదికను కాగ్ సమర్పించింది. ఇందులో గత ప్రభుత్వ చెర్రులూ, పెద్దకొత్తాన్ని ఎండగట్టింది. ఆదాయమే లేని కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు మూర్తి వాడికే రూ. 86,788 కోట్లను వెచ్చించేసింది. ఇది మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యేనాటికి రూ.1,41,545 కోట్లకు చేరుకుంటుందని పేర్కొన్నది. ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి 72.82% రుణాల ద్వారానే నిధులను సమకూర్చిందని తెలిపింది. ప్రస్తుతం టైల్డ్ ఎలిఫెంట్ తరహాలో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు రాష్ట్రానికి గురిబంధంగా తయారైంది. ఈ ప్రాజెక్టుకు చేసిన అప్పుల్ని తీర్చడానికి 14 ఏళ్లు పడుతుందని, ప్రతి ఏటా సగటున రూ. 14,462 కోట్లను చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. రెండేండ్ల కింద నుంచే అప్పులు చెల్లించాల్సి ఉన్నా నాటి ప్రభుత్వం గడువు కోరింది. ఫుటైండ్ అది వడ్డీ రూపంలో భారంగా చూస్తుందని కాగ్ రిపోర్టులో పేర్కొంది. ప్రభుత్వ గాఢాంతరీక రుణాలు తీసుకున్నందున కాళేశ్వరం

రంకో రూపాయి ఆదాయం లేకున్నా అప్పులు, వడ్డీలు కట్టే భారం ప్రభుత్వం మీదే ఉన్నదని తెలిపింది. ఒప్పందం ప్రకారం 2020-21 నుంచే అప్పులు చెల్లించాల్సి ఉన్నా డబ్బులు లేక మొత్తం 15 ఒప్పందాల్లో 9 అగ్రిమెంట్లలో రెండేళ్ల పాటు అదనపు గడువు కోరగా దానికి కూడా వడ్డీ పెరిగిందని పేర్కొన్నది.

ఆదాయమే లేకుండా ప్లానింగ్ :
కాళేశ్వరం డీపీఆర్ 2లో నీటి రెవీ విడించడోమంటూ నాటి ప్రభుత్వం చెప్పిందని గుర్తుచేసిన కాగ్.. ఆదాయమేమీ రాదని స్పష్టత ఇచ్చింది. కానీ, పరిశ్రమలకు నీటి సరఫరా, తాగునీటి, చేపల పెంపకం ద్వారా ఆదాయం వస్తున్నట్లు పేర్కొన్నదని, కానీ ఈ రూపాల్లో వచ్చేరి అంతంతమాత్రమేనని కాగ్ వివరించింది.

పరిపాలనా అనుమతుల్లో లోపాలు
ప్రాజెక్టు మొత్తానికి ప్రభుత్వం పరిపాలనా అనుమతులు ఇవ్వకుండా విడివిడి పనులకు వేరేరుగా ఇచ్చిందని, ప్రాజెక్టుకు నిర్దిష్టమైన ఫండ్ గో విధానం లేకుండా 2022 మార్చి నాటికి మొత్తం 73 పరిపాలనా అనుమతులను ఇచ్చింది. అందుకు రూ.1,10,248 కోట్లను రిలీజ్ చేసిందని కాగ్ తెలిపింది.


గురిబంధంగా విద్యుత్ బిల్లులు
కాళేశ్వరం నుంచి నీటిని ఎత్తిపోయడానికి వాడే పంపుస్టేషన్లు కరెంటు రూపేణా ఏటా 8,459 మెగావాట్ల (14,344 మిలియన్ యూనిట్లు) విద్యుత్ కావాల్సి ఉంటుంది. ఇది రాష్ట్రంలో ఉత్పత్తి అయ్యే కరెంటులో దాదాపు 46.82% అని వివరించింది. అన్ని పంపులూ ఒకేసారి పనిచేస్తే రోజుకు 203 మిలియన్ యూనిట్లు అవసరమవుతుందని, రాష్ట్రంలోని సగటు (196 మిలియన్ యూనిట్లు) కంటే ఎక్కువని తెలిపింది. అందుకు ఏటా రూ.10,647 కోట్లను

కార్యోరేషన్ పేరుతో రుణాలు
కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కోసం అవసరమైన నిధులను సమకూరుస్తామని అప్పటి సైన్ డిపార్టుమెంట్ సబ్ సెక్రటరీ ఇచ్చిన అప్పజిక్టి (2016 మార్చిలోని) ప్రత్యేక కార్యోరేషన్ ఏర్పాటుండు, లోన్లు తీసుకోడానికి సిద్ధమైందని కాగ్ ప్రస్తావించింది. వివిధ ప్రభుత్వ సంస్థల నుంచి కార్యరేషన్ మార్చి 2022 నాటికే రూ. 87,449 కోట్లను ప్రభుత్వ గ్యారంటీతో రుణంగా తీసుకుంది. ఇందుకు 7.8% నుంచి 10.9% వరకు పెటా వడ్డీ ఖర్చైంది. ప్రాజెక్టుకు మార్చి 2022 నాటికి చేసిన ఖర్చులో 64.3% మేర (రూ. 55,807 కోట్లు) రుణం ద్వారా తీసుకున్నదేమీ కాగ్ తెలిపింది.

ఇవ్వాలి ఉంటుందని, సగటున ఒక్కో ఎకరానికి విద్యుత్ రూపంలో సుమారు రూ.46, 364 కోట్లు ఖర్చవుతుందని కాగ్ స్పష్టంచేసింది.

అనుమతులు లేకుండా థర్డ్ టీఎంసీ పనులు
రోజుకు 2 టీఎంసీల నీటిని గోదావరి నుంచి తీసుకునేలా డీపీఆర్ లో నాటి ప్రభుత్వం పేర్కొన్నా థర్డ్ టీఎంసీని కూడా వాడుకునేందుకు డిజైన్ లో మార్పులు చేసిందని, కానీ ఈ విషయాన్ని కేంద్ర పర్యావరణ మంత్రిత్వశాఖకు చెప్పలేదని, అవసరమైన అనుమతులనూ తీసుకోలేదని కాగ్ ఎత్తిచూపింది. థర్డ్ టీఎంసీ నీటిని ఎత్తిపోయడానికి కొన్ని కొత్త లిఫ్ట్ పంపులనూ నెలకొల్పాల్సి వచ్చిందని, ఇందుకు అదనంగా రూ.28,151 కోట్లు తేలాయించగా.. ప్రాణహిత ఒరిజినల్ డిజైన్ తో పోలిస్తే విద్యుత్ ఖర్చు రూ.3,555 కోట్లు పెరిగిందని తెలిపింది.

మల్లన్న సాగర్ కు ముప్పు
కాళేశ్వరంలో అతి పెద్ద రిజర్వాయర్ ను 50 టీఎంసీల కెపాసిటీతో మల్లన్న సాగర్ ను రూపొందించినా ఎన్టీఆర్ (నేషనల్ జియోగ్రాఫిక్ రిసెర్చ్ ఇన్ స్టిట్యూట్) జరిపిన అధ్యయనంలో మాత్రం దాని కింద నిలుపునా చీలే లోపం ఉన్నదని కాగ్ ప్రస్తావించింది. భూకంప ప్రభావాన్ని స్టడీ చేయకుండానే రూ.6,126 కోట్లతో ఈ రిజర్వాయర్ ను టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం నిర్మించిందని, ఇరిగేషన్ డిపార్టుమెంట్ నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించిందని చెప్పింది.

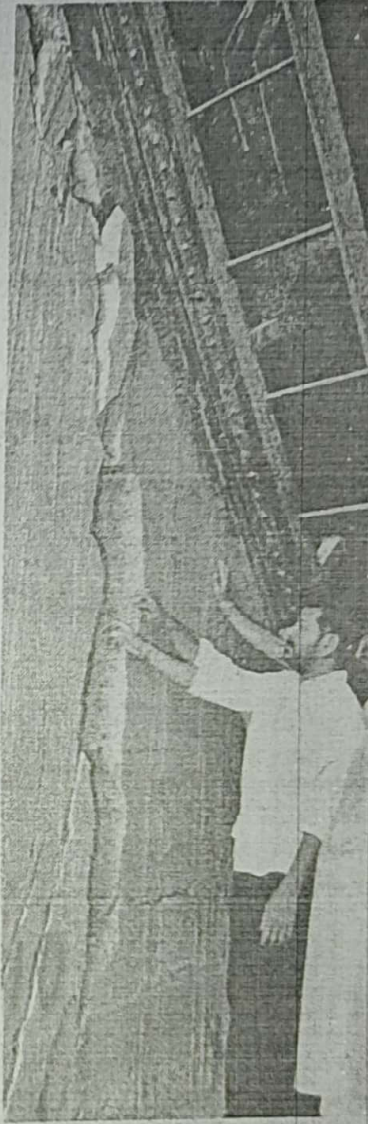

ప్లానింగ్ లేకుండా హడావిడి నిర్మాణం
విల్లిశెట్టిపాడు లోనుండనే హడావిడిగా ప్రాజెక్టు నిర్మాణం జరిగిందని, కేంద్ర బలసంహారక పంపిన డీపీఆర్ కు అనుమతి రాకముందే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కాన్ 2018లో రూ.25,049 కోట్లలో 17 పనులను చేపట్టిందని పేర్కొన్నది. డీపీఆర్ కు అమోదం దొరకకాకప్పు మార్పులు చేసి థర్డ్ టీఎంసీ పనులకు రూ.28,151 కోట్ల మేర అదనపు ఖర్చు చేసిందని, ఇది అవసరమైన ఖర్చు

కాగ్ చెప్పింది. సాగర్ కి ప్రకారం రూ.63,352 కోట్లగా మొత్తం అంచనా వ్యయాన్ని డీపీఆర్ లో ప్రభుత్వం పేర్కొన్నది. ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయాలంటే రూ.1.47 లక్షల కోట్ల వ్యయం అయ్యేలా ఉన్నదని వివరించింది. ఈ ప్రాజెక్టు లాగా ప్రతి ఎకరానికి సగటున గాత్రం కలిపి వారింటి రూ.6.42 లక్షల కోట్ల మేర ఖర్చు కావనప్పుడు పేర్కొన్నది.

పట్టే ఖర్చులో 48 పైసలు వృథా.
కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ఆర్థికంగా పనికిరాదని కాగ్ తన నివేదికలో స్పష్టంచేసింది. ప్రాజెక్టు ఖర్చును డీపీఆర్ లో పేర్కొన్న నాటి ప్రభుత్వం ఒక రూపాయికి ఒకటిన్నర రూపాయి ప్రయోజనం వస్తుందని పేర్కొన్నదని కాగ్ తెలిపింది. కానీ, ఈ ఏడాది జూన్ కల్లా పూర్తి కానున్నట్లు వేసిన, అంచనాతో పోలిస్తే ఒక రూపాయి ఖర్చుకు 52 పైసలు మాత్రమే ప్రయోజనం ఉంటుందని, మిగిలిన 48 పైసలు వ్యర్థమేనని కాగ్ కుండబద్దలు కొట్టింది.

కాంట్రాక్టరకే లాభం

కాళేశ్వరంపై వాస్తవాలను
దాచిన డీఆర్ఎస్

● తప్పుదేవ వట్టించేలా
డీపీఆర్ రూపకల్పన

రిక, తెలంగాణ బ్యూరో : కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు వెనిఫిట్ రైతులు, ప్రభుత్వానికంటే కాంట్రాక్టర్లకే మేలు ఎక్కువగా జరిగిందని కాగ్ అభిప్రాయపడింది. అనేక కోడాల్లో విశేషించిన కాగ్.. అసెంబ్లీకి సమర్పించిన 260 పేజీల రిపోర్టులో అప్పటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ తీరు, ప్రాజెక్టు డిజైన్, ప్లానింగ్ మొదలు ఎగ్జిక్యూషన్ వరకు చోటుచేసుకున్న లోపాలను బట్టబయలు చేసింది. అనాడు డీపీఆర్ అడిగితే కూడా నాటి ప్రభుత్వం ఇవ్వలేదని పేర్కొంది. ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయిలో కంప్లీట్ అయ్యి ఆశించిన ఫలాలు అందాలంటే ఎన్నో ఏళ్లు పడుతుందని వ్యాఖ్యానించింది.

● ప్రాజెక్టు-చేవెళ్ళ ప్రాజెక్టు రీ-డిజైన్ పేరిట కాళేశ్వరాన్ని గత డీఆర్ఎస్ సర్కార్ నిర్మించినా ఫలితం శూన్యం అని కాగ్ వెల్లడించింది. కాళేశ్వరం డీపీఆర్లో గత సర్కార్ గొప్పలు చెప్పుకున్నదని, తప్పుడు గణాంకాలను చూపిందని ఉదహరించింది. ప్రాజెక్టు ఖర్చు, దాని నుంచి వచ్చే ప్రయోజనం విషయంలో 1:151గా మార్చి చెప్పినా.. చివరకు 9ది.1:52 మాత్రమేనని తేల్చింది. అంటే ప్రతి రూపాయి ఖర్చుకు రూపాయిన్నర ప్రయోజనం ఉంటుందని డీపీఆర్లో పేర్కొన్నా.. ప్రస్తుతం అది 75 పైసల దగ్గర ఆగిందని, భవిష్యత్లో అది 52 పైసలకే పరిమితమవుతుందని పేర్కొన్నది.

● ఒక్కో టీఎంసీకి సుమారు 17,668 ఎకరాల మేర సాగవుతుందని డీపీఆర్లో పేర్కొన్నా..

వాస్తవానికి 10 వేల ఎకరాలకు మాత్రమే పరిమితమైందని వివరించింది. ఈ ప్రాజెక్టుతో 18.26 లక్షల ఎకరాల కొత్త ఆయకట్టు సాధ్యమని పేర్కొన్న డీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మార్చి 2022 నాటికి కేవలం 40,888 ఎకరాలకు మాత్రమే నీరు ఇవ్వగలిగిందని తెలిపింది. పాత ప్రాజెక్టు-చేవెళ్ళ డిజైన్ ద్వారా రంగారెడ్డి జిల్లాలో 2.47 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టు లక్ష్యంగా పెట్టుకుంటే.. కాళేశ్వరం రీ-డిజైన్ వలన ఆ జిల్లాలో సాగు ప్రయోజనం 50 వేల ఎకరాలకంటే తక్కువ భూమికే పరిమితమైంది.

● కాళేశ్వరంతో ఖరీఫ్, రబీ సీజన్లకు సాగు నీరు లభిస్తుందని డీపీఆర్లో పేర్కొన్నా 169 టీఎంసీల నీటిని మాత్రమే ఎత్తిపోసే అవకాశం ఉండటంతో ఏదో ఒక సీజన్కు మాత్రమే సరిపోనున్నట్లు కాగ్ తెలిపింది. నీటిని ఎత్తిపోయడానికి విద్యుత్ ఒక్కో యూనిట్కు రూ.3 ఖర్చవుతుందని డీపీఆర్లో పేర్కొంటే.. ఇప్పుడది రూ.6.40 (ఒక్కో యూనిట్)కు పెరిగిందని తెలిపింది. దీని ప్రకారం ఏటా ఒక్క విద్యుత్ బిల్లులకే రూ.10,647 కోట్లు కావాల్సి ఉంటుందని చెప్పింది.

● కాళేశ్వరంలోని మొత్తం 21 ప్యాకేజీలకు సంబంధించిన అగ్రిమెంట్లలో కేవలం గాలుగింటి వివరాలను మాత్రమే ప్రభుత్వం ఇచ్చిందని, మిగిలిన వాటిని రకరకాల కారణాలతో అందజేయలేదన్నది. ఈ 4 ప్యాకే

జీలకు అవసరమైన మోటార్లను బీచ్ఈఎల్ నుంచి రూ.1,689 కోట్లు వాస్తవ ధరతో కొంటే దాన్ని రూ.7,212 కోట్ల కాంట్రాక్టర్లు కొన్నట్లుగా తేలింది. పేర్కొన్నది. అంటే రూ.5,525 కోట్లు వే ఎక్కువ పేమెంట్ చేశారని, 327% వే ఎక్కువ ధర కోట్ చేసినట్లు ఆ నివేదికలో కచ్చితమైందని. దీని ప్రకారం కాంట్రాక్టర్ల అనుచిత లబ్ధి చేకూరిందని, అన్ని ప్యాకేజీల పరిశీలిస్తే దీనివలన చాలా ఎక్కువ ఉందని తెలిపింది.

● ఇక ఆయకట్టు విషయంలో ప్రభుత్వం లెక్కలు, ఆయా సర్కిల్ ఇంజనీర్లు చెప్పే లెక్కల మధ్య చాలా వ్యత్యాసం ఉన్నట్లు కాగ్ పేర్కొంది. కొత్త ఆయకట్టు టార్గెట్ 18.26 లక్షల ఎకరాలైతే మార్చి 2022 నాటికి కేవలం 40,888 ఎకరాలే సాధ్యమైందని.. 3.43 లక్షల ఎకరాలకు డిస్టిబ్యూటరీ నెట్వర్క్ కాలేదని, మరో 14.83 లక్షల ఎకరాల పంపిణీ వ్యవస్థ సమకూరినా నీరు అందలే వివరించింది.

● కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల ద్వారా విద్యుత్ వినియోగం తక్కువేనని, వార్షిక బిల్లు తక్కువే వస్తాయని ఒక్కో యూనిట్ ధర నగానికిపైగా తగ్గించి గత ప్రభుత్వం డీపీఆర్లో చూపించింది. ప్రాజెక్టు అనుచిత సమర్పించే కాగ్ నివేదికలో వాస్తవ వార్షిక నిర్వహణకయ్యే ఖర్చును తక్కువగా చూపి అధిక ప్రయోజనాలు వస్తాయని నమ్మించిందని కాగ్ వివరించింది.



కాగ్ కన్నెర్

● దుబారా పెంచారు-ఫాయిదా మరిచారు

● అసెంబ్లీలో నివేదికతో సర్కార్ డొల్లతనం బట్టబయలు

● కాశేశ్వరంపై కీలక అంశాల ప్రస్తావన

SURYA
16/2/24

తెలంగాణ బ్యూరో ప్రతినిధి: హైదరాబాద్: తెలంగాణ రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో కాగ్ నివేదికను గురువారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశ పెట్టింది. కాశేశ్వరం వ్యయం భారీగా పెరిగినప్పటికీ, ప్రయోజనాల్లో అదనపు పెరుగుదల లేదని కాగ్ పేర్కొంది. కాశేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు ప్రతి ఏటా విద్యుత్ వినియోగానికి రూ. 3.555 కోట్లు అదనపు వ్యయం పెరిగిందని ఈ నివేదిక వివరించింది. రీ ఇంజనీరింగ్ మార్పుల వల్ల అప్పటికే చేసిన కొన్ని పనులు నిరర్థకమయ్యాయని కాగ్ నివేదిక వెల్లడించింది. రీ ఇంజనీరింగ్ మార్పుల వల్ల రూ. 765 కోట్ల నష్టం వాటిల్లిందన్నారు. పనుల అప్పగింపులో నీటిపారుదల తొందరపాటు ప్రదర్శించిందని కాగ్ అభిప్రాయపడింది. డీపీఆర్ ఆమోదానికి ముందే రూ. 25 వేల కోట్ల విలువైన 17 పనులు అప్పగించారని కాగ్ నివేదిక తెలిపింది. అవసరం లేకున్నా కాశేశ్వరం మూడో టీఎంసీ పనులు చేపట్టారని కాగ్ అభిప్రాయపడింది. అదనపు టీఎంసీ కోసం చేపట్టిన పనులతో రూ. 25 వేల కోట్లు అదనపు వ్యయంగా కాగ్ తెలిపింది. సాగునీటిపై మూలధన వ్యయం ఒక్కో ఎకరానికి రూ. 6.42 లక్షలు అవుతుందని కాగ్ వివరించింది. ప్రాజెక్టు ప్రయోజన వ్యయ నిష్పత్తి 1.51 గా అంచనా వేసినట్లుగా కాగ్ తెలిపింది. ప్రాజెక్టు ప్రయోజన వ్యయ నిష్పత్తి 0.75 గా తేలిందని కాగ్ వివరించింది. అంతేకాదు ప్రాజెక్టు ప్రయోజన, వ్యయ నిష్పత్తి మరింత తగ్గే అవకాశం కూడా ఉందని కాగ్ అభిప్రాయపడింది. లోతైన భూకంప సంబంధిత అధ్యయనాలు చేయకుండానే మల్లన్నసాగర్ నిర్మించినట్లుగా కాగ్ పేర్కొంది. 2022 మార్చి నాటికి రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితులపై కాగ్ నివేదికను వెల్లడించింది. రెవిన్యూ రాబడి ఎక్కువ చూపి రెవెన్యూ లోటును తక్కువ చూపినట్లుగా కాగ్ అభిప్రాయపడింది. విద్య, వైద్యం మీద ఖర్చులో రాష్ట్రం వెనుకబడి ఉందని తెలిపింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసిన వ్యయంలో విద్యపై 8 శాతం మాత్రమే ఖర్చు చేశారని కాగ్ వివరించింది. మొత్తం వ్యయంలో ఆరోగ్యంపై 4 శాతం మాత్రమే ఖర్చు చేశారని కాగ్ తెలిపింది. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ మధ్య అస్తులు, అప్పుల పంపకంపై వురోగతి లేదని కాగ్ వివరించింది. విభజన ఆస్తుల పంపకాల విషయమై తగినంత దృష్టి లేదని కాగ్ అభిప్రాయపడింది. రూ. 1.18 లక్షల కోట్ల బడ్జెట్ వెలుపలి రుణాలను బడ్జెట్ లో వెల్లడించలేదని కాగ్ పేర్కొంది. అప్పుల ద్వారానే రెవిన్యూ లోటును భర్తీ చేయాల్సి వచ్చిందని కాగ్ తెలిపింది. రుణాలపై వడ్డీ 2032-33 నాటికి రూ. 2.52 లక్షల కోట్లు చెల్లించాల్సి వస్తుందని కాగ్ అభిప్రాయపడింది. బడ్జెట్ కేటాయింపులతో పోలిస్తే సంక్షేమ పథకాలపై ఖర్చు తక్కువగా ఉందని కాగ్ వివరించింది.
